

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设 项目绩效评价报告

委托评价单位：临泽县财政局

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设
项目

评价对象主体：临泽县板桥镇人民政府

评价报告时间：2024 年 9 月

摘 要

为强化部门资金绩效管理，提高资金使用效益，临泽县财政局委托甘肃道瑞科技咨询有限公司对板桥镇 2023 年基层政权建设项目开展重点绩效评价，报告摘要如下：

一、项目概况

基层政府是农村基层组织建设的重要载体，是基层组织联系群众、服务群众的窗口和纽带，是农村开展各项工作和活动的基本阵地。强化基层组织阵地建设，已成为加强基层组织建设的重要基础性工作，也是加快推进农村经济发展的必然要求。

乡镇政府是国家法律法规政策落实到“最后一公里”的重要执行者，是基本公共服务的重要提供者，是基层治理的重要组织者，是实施乡村振兴战略的重要推动者。

为了支持基层政权的建设，改善乡镇办公条件，临泽县板桥镇人民政府提出了该项目的建设。该项目的建设改善镇政府办公设施条件，充分调动干部职工扎根基层、干事创业的积极性主动性，创造安全、便利、舒适的办公和生活环境，促进基层服务能力提升。

板桥镇 2023 年基层政权建设项目主要实施内容为：社会治安综合治理服务中心拆除墙面、门窗等装饰面 2150.00 m²；铺设外墙防水 400.00 m²，外墙粉刷 1700.00 m²；室内装饰墙面板 120.00 m²，吊顶 160.00 m²，内墙粉刷 130.00 m²；外立面浇筑框架檐口 750.00 m²，改造断桥隔热窗户 80.00 m²办公用房墙面粉刷 1500.00 m²，配套安装独立卫生间、衣柜、书桌各 50 套；维修改造储物间 5 间，洗衣房 2 间；维修改造化粪池 40.00m³；维修改造电路、给排水管网及附属设施等。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**86.32**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效评价结果等级为：**良**。

临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效评价总体得分情况

序号	指标名称	权重	得分	得分率
1	决策	23.00	21.00	91.30%
2	过程	19.00	14.25	75.00
3	产出	25.00	22.00	88.00
4	效益	33.00	29.07	88.09
总分		100.00	86.32	86.32%

三、项目主要经验及做法

（一）科学规划与精细管理

一是项目规划科学，项目在规划阶段就明确了维修改造的具体内容和目标，确保项目能够精准对接实际需求，避免资源浪费。通过详细的项目预算编制，确保项目资金使用的合理性和有效性；二是精细管理，项目实施过程中，采用精细化管理手段，对工程进度、质量、安全等方面进行全方位监控，确保项目顺利推进。严格履行合同要求，确保项目按时按质完成。

（二）加强质量监督

一是在项目启动阶段，明确项目的目标和计划，确保项目能按照预期计划实施；二是设立监督机制，在项目执行过程中，通过设立监督机制来跟踪项目的进展，定期召开项目例会，进行项目进度和风险的评估，及时解决项目中的问题和障碍；三是定期进行项目评估，在

项目执行过程中，通过定期的项目评估来对项目的进展、资源消耗、风险等进行评估和审查，及时发现问题，并采取相应的措施予以解决。

（三）注重后期维护与保养

一是建立长效机制，项目完成后，重视后期维护与保养工作，建立长效机制，确保办公用房及设施设备的长期稳定运行。定期对办公用房进行清洁、检查和维护，及时发现并解决问题；二是提高使用效率通过维修改造，提升办公用房的使用效率和舒适度，为工作人员提供更好的工作环境。优化办公布局和设施配置，提高办公效率和工作质量。

四、存在的问题

（一）项目未招标先建，违反招标投标法

根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，对于必须进行招标的项目，如果不按照规定进行招标而直接开工建设，将构成违法行为。根据评价组实地调研及访谈了解到，板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目于2022年11月开工建设，2023年11月底完工，但该项目实际在2023年11月20日，在张掖市公共资源交易中心完成招投标工作，2023年12月1日签订施工合同。项目实施早于前期准备工作，单位监管力度不足。

（二）项目未进行完工验收，监管不到位

项目的竣工验收是保证合同任务完成、提高质量水平的最后关口。通过验收，可以全面检查项目的完成情况和质量水平，确保项目符合合同要求和相关标准。这有助于提升项目的整体质量和可靠性，为后续的使用和运营打下坚实基础。根据资料核查发现，截至2024年8月22日板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目

只做了内部决算，未进行项目完工验收便投入使用。项目未进行验收即投入使用，可能导致项目中的质量问题被掩盖，给后续使用带来安全隐患。

五、有关建议

（一）加强法律法规意识，优化招投标流程

一是加强对《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的宣传，确保政府单位及其工作人员充分认识到招投标的重要性和必要性。建立健全政府单位项目招投标的监督机制，明确监管主体、监管职责和监管方式；二是优化单位项目招投标的审批流程，减少不必要的环节和手续，提高审批效率。推行电子化招投标，实现招投标活动的在线办理和监管。

（二）完善项目管理制度，强化沟通协调与协作

一是建立项目验收制度，制定详细的项目验收标准和流程，明确验收的各个环节和责任人；二是加强项目过程管理，在项目实施过程中，加强对项目进度、质量、安全等方面的监管，确保项目按照既定计划进行；三是加强内部沟通，单位内部各部门之间应加强沟通协调，确保项目信息的及时传递和处理；四是加强与项目相关方的协作，与项目的设计、施工、监理等单位保持密切协作，共同推进项目实施和验收工作。

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 主要内容.....	1
(三) 绩效目标.....	4
(四) 项目实施情况.....	5
(五) 资金投入.....	6
(六) 资金使用情况.....	6
二、评价基本情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
(二) 评价原则及标准.....	7
(三) 评价方法.....	8
(四) 绩效评价指标体系.....	10
(五) 绩效评价组织过程.....	12
三、综合评价结论及分析.....	14
(一) 综合评价情况及评价结论.....	14
(二) 指标完成情况.....	14
1.决策情况(23分)(-2分).....	15
2.过程情况(19分)(-4.75分).....	17
3.项目产出(25分)(-3分).....	19
4.项目效益(33分)(-3.93分).....	21
四、项目主要经验及做法.....	22
(一) 科学规划与精细管理.....	22
(二) 加强质量监督.....	23
(三) 注重后期维护与保养.....	23
五、存在的问题.....	23
(一) 项目未招标先建,违反招标投标法.....	23

(二) 项目未进行完工验收, 监管不到位	24
六、有关建议	24
(一) 加强法律法规意识, 优化招投标流程	24
(二) 完善项目管理制度, 强化沟通协调与协作	24
七、需要说明的问题	25
八、有关附件	25
附件一 临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目评分表	26
附件二 满意度报告	42
附件三 访谈报告	60
附件四 基础信息表	63
附件五 主评人资质证明	65

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

基层政府是农村基层组织建设的重要载体，是基层组织联系群众、服务群众的窗口和纽带，是农村开展各项工作和活动的基本阵地。强化基层组织阵地建设，已成为加强基层组织建设的重要基础性工作，也是加快推进农村经济发展的必然要求。

乡镇政府是国家法律法规政策落实到“最后一公里”的重要执行者，是基本公共服务的重要提供者，是基层治理的重要组织者，是实施乡村振兴战略的重要推动者。

现阶段，乡镇政府公共服务能力不足，服务内容结构性失衡、服务供需脱节以及服务效能滞后，成为贯彻落实乡村振兴战略、推动实现农业农村全面振兴的制约因素。管理运行体制方面的责权不相匹配，经费保障不足、乡镇运转困难，基础设施设备落后，工作生活条件差，乡级债务包袱重、发展资金短缺。乡镇日常运转十分困难，一些工作无法正常开展，乡镇工作生活条件比较艰苦。为了支持基层政权的建设，改善乡镇办公条件，临泽县板桥镇人民政府提出了该项目的建设。该项目的建设改善镇政府办公设施条件，充分调动干部职工扎根基层、干事创业的积极性主动性，创造安全、便利、舒适的办公和生活环境，促进基层服务能力提升。

（二）主要内容

板桥镇 2023 年基层政权建设项目主要实施内容为：社会治安综

合治理服务中心拆除墙面、门窗等装饰面 2150.00 m²；铺设外墙防水 400.00 m²，外墙粉刷 1700.00 m²；室内装饰墙面板 120.00 m²，吊顶 160.00 m²，内墙粉刷 130.00 m²；外立面浇筑框架檐口 750.00 m²，改造断桥隔热窗户 80.00 m² 办公用房墙面粉刷 1500.00 m²，配套安装独立卫生间、衣柜、书桌各 50 套；维修改造储物间 5 间，洗衣房 2 间；维修改造化粪池 40.00m³；维修改造电路、给排水管网及附属设施等。详细建设内容如下所示：

1.外墙窗户更换

该项目将原建筑内外窗拆除，在不改变结构的前提下进行更换，统一更换为断桥隔热铝合金中空玻璃窗，其气密性为 6 级水密性为 3 级。防火墙两侧的门窗玻璃均为 C 类防火玻璃。

2.外墙防水及装饰

(1) 清洗外墙基层表面的涂料、污渍。墙面沙眼等地方对细部处理；

(2) 外墙龟裂的地方比较大，用无纺布和外墙专用涂料进行修补，对于窗户、预埋件等重要部位做好加强处理；

(3) 粉刷外墙防水涂料，底漆一定要涂刷到位，等到防水涂料凝固之后再涂刷第二遍防水涂料。涂料涂刷的厚度一般在 0.5mm 左右；

(4) 外墙施工完成之后，还需要进行淋水试验，检查外墙的防水性。

3.内墙面粉刷

将原有涂料铲至砂浆层，满刮 3 厚地基防裂刮 2 厚腻子分遍找平，内墙乳胶漆饰面。墙面有裂缝的部位应贴 50 宽涂塑中碱玻纤网格布，

然后满刮 2 厚耐水腻子分遍找平，涂饰部分材料及颜色由建设单位确定。

4.吊顶

(1) 拆除原吊顶及附件；

(2) 龙骨吸顶吊件，中距横向<1200，纵向 600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定；

(3) T 型轻铜主龙骨 TB24x38（或 TB24x28），间距<1200，用吸顶吊件联结；

(4) T 型轻铜横撑龙骨 TB24x28，间距 600，与主龙骨插接；

(5) 600*600 板材与配套专用龙骨固定。

5.化粪池

截断与旧化粪池相关联的进水管线，在出水管断流期间采用污水车抽水外运。挖去原化粪池上部土方以卸去化粪池荷载，观察化粪池变形及池壁情况进行维修，待混凝土达到强度人工分层回填至原地面表高。

6.洗衣房改造

(1) 室内给排水管改造

洗衣房排水支管采用 DN110 的 U-PVC 管，粘接连接，给水管采用 DN50PPR 管。

(2) 吊顶

对洗衣房进行吊顶，至顶板处，材料选用铝合金方板吊顶。

7.排水管网

本项目维修改造室外污水管网管材采用 DN200PVC 管，承插连接，直埋敷设，并采用中粗砂垫层基础。管道敷设最小覆土深度不小

于该地区最大冻土深度（最大冻土深度 132cm）。室外排水采用雨污分流制，污水经化粪池处理后汇入排水管网。

（三）绩效目标

该项目建成后，可改善基层乡镇人民政府办公条件和基础设施条件，稳定推进行政管理体制改革的，进一步发挥临泽县基层镇人民政府的行政管理职能、加快基层镇建设，促进社会公共服务与经济社会发展同步提高，加快城市化进程。



填报单位（盖章）：板桥镇人民政府

项目名称	板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目		项目负责人及电话	刘增武 13830608280
主管部门	临泽县财政局	实施单位	板桥镇人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额	100		
	财政投入资金	100		
	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	100		
总体目标	年度目标			
	拆除镇社会治安综合治理服务中心墙面、门窗等装饰面2200m ² ；外墙面防水400m ² ，喷刷涂料1700m ² ；室内装饰墙板120m ² ，吊顶160m ² 、喷刷涂料130m ² ；外立面浇筑框架檐口750m ² 。提升改造办公用房50间，粉刷墙面1500m ² ；安装独立卫生间、衣柜、书桌50套；维修改造储物间5间、洗衣房2间；维修改造化粪池40m ² ；维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设；改造断桥隔热窗户80m ² 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	拆除墙面、门窗等装饰面	2200m ²
			外墙面防水	400m ²
			喷刷涂料	1700m ²
			外立面浇筑檐口	750m ²
			改造办公用房	50间
			安装独立卫生间、衣柜、书桌	50套
			改造储物间、洗衣房	7间
			化粪池	40m ²
			改造断桥隔热窗户	80m ²
	质量指标	工程验收合格率	100%	
		附属设施使用率	100%	
		时效指标	建设完工时限	3个月
			资金支付率	100%
成本指标	项目（工程）完成及时率	100%		
	财政补助资金	100万元		
效益指标	社会效益指标	受益人数	67人	
	生态效益指标	办公及居住场所条件	明显改善	
	可持续影响指标	工程使用年限	10年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	

（四）项目实施情况

板桥镇 2023 年基层政权建设项目实际完成情况：拆除墙面、门窗等装饰面 2203 m²；外墙面防水 425 m²，喷刷涂料 1685 m²；室内装饰墙板 120 m²、吊顶 168 m²、喷刷涂料 130 m²；外立面浇筑框架檐口

748 m²。提升改造办公用房 50 间，粉刷墙面 1500 m²，维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间；维修改造化粪池 40m³；维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设；改造断桥隔热窗户 76.4 m²。

（五）资金投入

板桥镇 2023 年基层政权建设项目总投资 150.00 万元，其中：建筑安装工程费用 126.65 万元，其他工程费用 16.21 万元，基本预备费 7.14 万元。

（六）资金使用情况

截至 2024 年 8 月，板桥镇 2023 年基层政权建设项目实际支出 100 万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目。

评价的时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

资金范围：项目资金共计 100 万元。

（二）评价原则及标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目进行客观、公正的绩效评价。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价标准

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准

本次评价过程中广泛使用计划标准，将临泽县板桥镇 2023 年基

层政权建设项目年初预算编制的绩效目标申报表，与绩效监控运行表、绩效自评报告以及自评表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，考察项目建设是否如期完成年度预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

（2）行业标准

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

（3）历史标准

参照临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目及临泽县板桥镇往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对临泽县板桥镇人民政府工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

（4）其他标准

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本

原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根据项目实际情况抉择）。

1.成本效益分析法

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目进行重点评价，考察项目成本与效益是否匹配。

2.比较法

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

3.因素分析法

通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

4.最低成本法

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，

比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

5.公众评判法

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与临泽县财政局（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目情况的客观评价，具体问卷调查详见附件满意度分析报告，具体访谈详见附件访谈报告。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量及产出质量情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.项目决策

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

2.项目过程

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。

一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查，一是对对应合同规定的项目内容进行评价，对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进行考评；二是根据相关验收标准，对项目实施质量进行评价。

4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表如下，详细的评价指标体系见附件一。

表 2-1 临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价指标体系（简表）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分
		A102 立项程序规范性	3.00	规范
	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理
		A202 绩效指标明确性	3.00	明确
		A203 绩效监控有效性	3.00	有效

		A204 绩效自评规范性	4.00	规范
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3.00	科学
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%
		B102 预算执行率	3.00	100%
		B103 资金使用合规性	4.00	合规
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	2.00	健全
		B202 制度执行有效性	3.00	有效
		B203 政府采购规范性	4.00	规范
C 产出	C1 产出数量	C101 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成情况	12.00	100%
	C2 产出质量	C201 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成验收合格情况	6.00	100%
	C3 产出时效	C301 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成及时情况	3.00	及时
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	4.00	≤ 100%
D 效益	D1 社会效益	D101 办公环境提升性	6.00	提升
		D102 办公效率提升性	6.00	提升
		D103 群众安全感提升性	5.00	提升
	D2 可持续影响	D201 长效管理机制健全性	4.00	具备
	D3 服务对象满意度	D301 办事群众满意度	6.00	90%
		D302 工作人员满意度	6.00	90%
合计			100.00	-

（五）绩效评价组织过程

1.前期调研

根据临泽县财政局 2024 年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟

定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县财政局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。

3.数据采集

本次绩效评价调研工作评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：**一是**资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；**二是**评价组对所收集调查问卷受益群众 71 份进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；**三是**将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；**四是**形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4.报告撰写

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**86.32**分。根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目的实施是加强基层政权建设的重要举措，通过该项目的实施，排除了存在的安全隐患，办公条件得到了极大地改善，提升了基层政权服务能力，提高了社会治理效率，方便了群众办事，群众满意度得到了提升，为推动全镇经济和社会各项事业的全面发展起到了积极的促进作用。

（二）指标完成情况

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效管理情况进行分析评价。

临泽县板桥镇2023年基层政权建设项目绩效评价总体得分情况如下图所示：

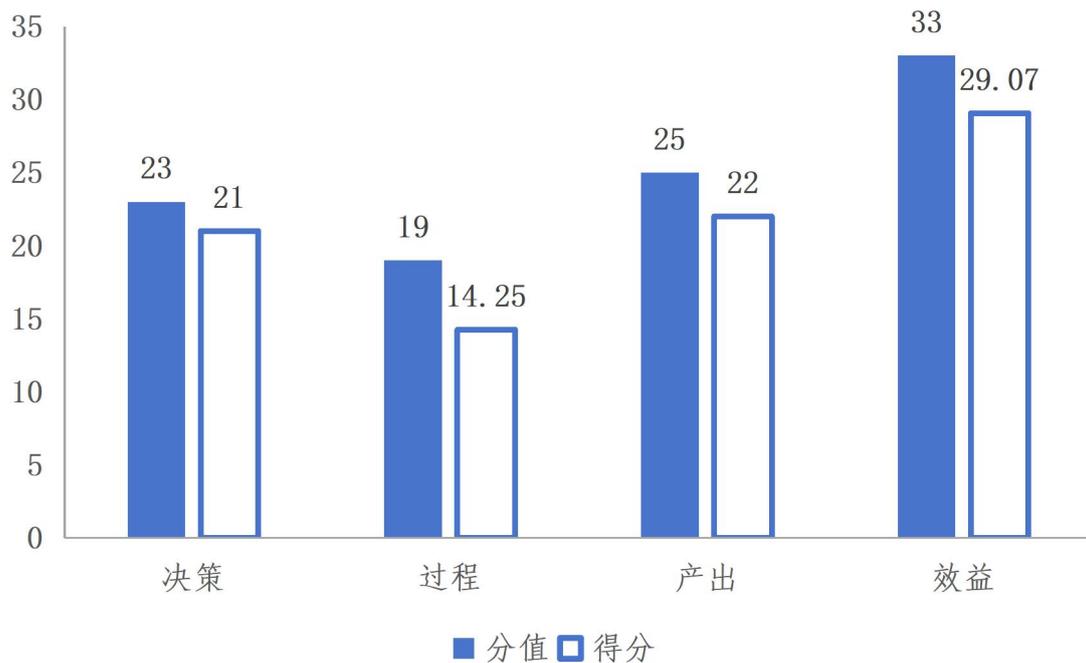


图 3-1 临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价总体得分情况

1.决策情况（23 分）（-2 分）

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目决策维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-1 决策维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分	3.00
		A102 立项程序规范性	3.00	规范	3.00
	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理	4.00
		A202 绩效指标明确性	3.00	明确	3.00
		A203 绩效监控有效性	3.00	有效	3.00
		A204 绩效自评规范性	4.00	规范	2.00
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3.00	科学	3.00
合计			23.00	-	21.00

（1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①项目立项符

合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 33.3%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A102 立项程序规范性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①项目按照规定的程序申请设立，得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，得 33.3%权重分；③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

(2) 绩效管理

“A201 绩效目标合理性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据《绩效目标表（2023 年度）》①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 50%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“A202 绩效指标明确性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据《绩效目标表（2023 年度）》①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 20%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 40%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A203 绩效监控有效性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据所提供的《项目资金支出绩效目标执行监控表》①开展绩效监控工作；②对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，得 50%权重分；③项目实施未发生偏离，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A204 绩效自评规范性”指标分值 4.00 分，得分 2.00 分。

根据所提供的《绩效自评情况的报告》①开展项目绩效自评工作；②绩效自评为设置权重对各项指标进行打分，未对各指标完成情况进行打分，该项不得分；③对偏离情况进行偏差原因分析，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 50%权重分，得 2.00 分。

（3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值 3.00，得分 3.00 分。

根据资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①项目具备预算编制相关资料，如《板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目总投资估算审定表》，得 25%权重分；②预算编制经过科学论证，得 25%权重分；③预算内容与项目内容匹配，得 25%权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

2.过程情况（19分）（-4.75分）

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-2 过程维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%	3.00
		B102 预算执行率	3.00	100%	3.00

		B103 资金使用合规性	4.00	合规	4.00
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全	2.00	健全	2.00
		B202 制度执行有效性	3.00	有效	2.25
		B203 政府采购规范性	4.00	规范	0.00
合计			19.00	-	14.25

(1) 资金管理

“B101 资金到位率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

板桥镇 2023 年基层政权建设项目预算批复 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率为 100%，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B102 预算执行率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

板桥镇 2023 年基层政权建设项目预算批复 100 万元，实际到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B103 资金使用合规性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据提供的项目明细账及会计凭证，板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金支付①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定，得 50%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

(2) 组织实施

“B201 项目管理制度健全性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据实地调研及资料核查，板桥镇①已制定相应的《财务管理办法》和相应的业务管理制度，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指

标得 100%权重分，得 2.00 分。

“B202 制度执行有效性”指标分值 3.00 分，得分 2.25 分。

根据资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施①该项目存在先建后申请情况，该项不得分；②项目实施未发生调整，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分；④落实项目法人制、招投标制和监理制，得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 2.25 分。

“B203 政府采购规范性”指标分值 4.00 分，得分 0.00 分。

根据资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目先实施后进行政府采购，不符合评分标准，该指标不得分。

3.项目产出（25分）（-3分）

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-3 产出维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
C 产出	C1 产出数量	C101 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成情况	12.00	100%	9.00
	C2 产出质量	C201 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成验收合格情况	6.00	100%	6.00
	C3 产出时效	C301 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成及时情况	3.00	及时	3.00
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	4.00	≤ 100%	4.00
合计			25.00	-	22.00

（1）产出数量

“C101 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成情况”指标分值 12.00 分，得分 9.00 分。

根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①

拆除墙面、门窗等装饰面计划实施 2200 平方米，实际实施 2203 平方米；②外墙面防水计划实施 400 m²，实际实施 425 m²；③墙面喷刷涂料计划实施 1700 m²，实际实施 1685 m²；④计划实施室内装饰墙板 120 m²，吊顶 160 m²、喷刷涂料 130 m²，实际实施室内装饰墙板 120 m²，吊顶 168 m²、喷刷涂料 130 m²；⑤外立面浇筑框架檐口计划实施 750 m²，实际实施 748 m²；⑥计划安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套，维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间，实际安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套，维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间；⑦计划维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设 0 米，实际维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设 600 米；⑧计划改造断桥隔热窗户 80 m²，实际实施 76.4 m²。其中②③⑦计划实施内容与实际实施内容相差较大，依据评分标准扣 3 分，该指标得 9.00 分。

(2) 产出质量

“C201 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成验收合格情况”指标分值 6.00 分，得分 6.00 分。

根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得 20%权重分；②验收合格率达到 100%，得 80%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 6.00 分。

(3) 产出时效

“C301 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成及时情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目按批复按时完工，得 100%权重分，得 3.00 分。

(4) 产出成本

“C401 成本控制情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

该项目投资预算 150 万元，实际成本支出 150 万元，该项目成本控制率为 100%，得 100%权重分，得 4.00 分。

4.项目效益（33 分）（-3.93 分）

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目效益维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-4 效益维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
D 效益	D1 社会效益	D101 办公环境提升性	6.00	提升	5.70
		D102 办公效率提升性	6.00	提升	5.41
		D103 群众安全感提升性	5.00	提升	4.58
	D2 可持续影响	D201 长效管理机制健全性	4.00	具备	4.00
	D3 服务对象满意度	D301 办事群众满意度	6.00	90%	5.51
		D302 工作人员满意度	6.00	90%	3.87
合计			33.00	-	29.07

(1) 社会效益

“D101 办公环境提升性”指标分值 6.00 分，得分 5.70 分。

根据问卷分析，在本次调研的 18 位工作人员中，社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，认为办公效率是否提升，“明显提升”占“83.33%”，“有提升”占“16.67%”，“提升一般”占“0%”，“没有提升”占“0%”。依据评分标准，酌情扣分，该指标得 95%权重分，得 5.70 分

“D102 办公效率提升性”指标分值 6.00 分，得分 5.41 分。

根据问卷分析，71 位受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作人员办事效率的满意度为 90.14%，依据评分标准，酌

情扣分，该指标得 90.14%权重分，得 5.41 分

“D103 群众安全感提升性”指标分值 5.00 分，得分 4.58 分。

根据问卷分析，71 位受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目维护与管理情况满意度为 91.56%，依据评分标准，酌情扣分，该指标得 90.56%权重分，得 4.58 分。

(2) 可持续影响

“D201 长效管理机制健全性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目建设完工后建立了资产管理机制(包括登记备案、权属界定、日常管护)、监督管理机制(包括信息公开、审计监督、群众参与)等后续管理机制，使得单位能够持续运行，避免出现只建不管情况。该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

(3) 服务对象满意度

“D301 办事群众满意度”指标分值 6.00 分，得分 5.51 分。

根据问卷分析，办事群众对“临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目”满意度为 91.83%，依据评分标准，该指标得 91.83%，得 5.51 分。

“D302 工作人员满意度”指标分值 4.00 分，得分 3.87 分。

根据问卷分析，工作人员项目满意度为 96.67%，依据评分标准，该指标得 96.67%，得 3.87 分。

四、项目主要经验及做法

(一) 科学规划与精细管理

一是项目规划科学，项目在规划阶段就明确了维修改造的具体内容和目标，确保项目能够精准对接实际需求，避免资源浪费。通过详

细的项目预算编制，确保项目资金使用的合理性和有效性；二是精细管理，项目实施过程中，采用精细化管理手段，对工程进度、质量、安全等方面进行全方位监控，确保项目顺利推进。严格履行合同要求，确保项目按时按质完成。

（二）加强质量监督

一是在项目启动阶段，明确项目的目标和计划，确保项目能按照预期计划实施；二是设立监督机制，在项目执行过程中，通过设立监督机制来跟踪项目的进展，定期召开项目例会，进行项目进度和风险的评估，及时解决项目中的问题和障碍；三是定期进行项目评估，在项目执行过程中，通过定期的项目评估来对项目的进展、资源消耗、风险等进行评估和审查，及时发现问题，并采取相应的措施予以解决。

（三）注重后期维护与保养

一是建立长效机制，项目完成后，重视后期维护与保养工作，建立长效机制，确保办公用房及设施设备的长期稳定运行。定期对办公用房进行清洁、检查和维护，及时发现并解决问题；二是提高使用效率通过维修改造，提升办公用房的使用效率和舒适度，为工作人员提供更好的工作环境。优化办公布局和设施配置，提高办公效率和工作质量。

五、存在的问题

（一）项目未招标先建，违反招标投标法

根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，对于必须进行招标的项目，如果不按照规定进行招标而直接开工建设，将构成违法行为。根据评价组实地调研及访谈了解到，板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目于2022年11月开工建设，2023

年 11 月底完工，但该项目实际在 2023 年 11 月 20 日，在张掖市公共资源交易中心完成招投标工作，2023 年 12 月 1 日签订施工合同。项目实施早于前期准备工作，单位监管力度不足。

（二）项目未进行完工验收，监管不到位

项目的竣工验收是保证合同任务完成、提高质量水平的最后关口。通过验收，可以全面检查项目的完成情况和质量水平，确保项目符合合同要求和相关标准。这有助于提升项目的整体质量和可靠性，为后续的使用和运营打下坚实基础。根据资料核查发现，截至 2024 年 8 月 22 日板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目只做了内部决算，未进行项目完工验收便投入使用。项目未进行验收即投入使用，可能导致项目中的质量问题被掩盖，给后续使用带来安全隐患。

六、有关建议

（一）加强法律法规意识，优化招投标流程

一是加强对《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的宣传，确保政府单位及其工作人员充分认识到招投标的重要性和必要性。建立健全政府单位项目招投标的监督机制，明确监管主体、监管职责和监管方式。加强对项目招投标全过程的监督，确保招投标活动的公开、公平、公正；二是优化单位项目招投标的审批流程，减少不必要的环节和手续，提高审批效率。推行电子化招投标，实现招投标活动的在线办理和监管。加强招投标信息的公开透明度，及时发布招标公告、中标结果等信息。

（二）完善项目管理制度，强化沟通协调与协作

一是建立项目验收制度，制定详细的项目验收标准和流程，明确

验收的各个环节和责任人。实行项目验收责任制，将验收责任落实到具体部门和人员，确保验收工作的顺利进行。二是加强项目过程管理，在项目实施过程中，加强对项目进度、质量、安全等方面的监管，确保项目按照既定计划进行。及时发现并纠正项目实施中的问题，防止问题积累导致项目无法按时验收。三是加强内部沟通，单位内部各部门之间应加强沟通协调，确保项目信息的及时传递和处理。四是加强与项目相关方的协作，与项目的设计、施工、监理等单位保持密切协作，共同推进项目实施和验收工作。定期组织项目协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题和困难。

七、需要说明的问题

无。

八、有关附件

附件一 板桥镇 2023 年基层政权建设项目评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础信息表

附件五 主评人资质证明

附件一 临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
A 决策										
	A1 项目立项									
		A101 立项依据充分性	3.00	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况		充分	行业标准	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项符合部门相关政策要求;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中,要素①②③各占 33.3%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,板桥镇 2023 年基层政权建设项目①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 33.3%权重分;②项目立项符合部门相关政策要求,得 33.3%权重分;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 33.3%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		A102 立项程序规范性	3.00	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		规范	通用标准	①项目按照规定的程序申请设立;②项目立项审批文件、材料符合相关要求;③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策等。以上三项中,要素①②③各占33.3%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,板桥镇2023年基层政权建设项目①项目按照规定的程序申请设立,得33.3%权重分;②项目立项审批文件、材料符合相关要求,得33.3%权重分;③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策,得33.3%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00
	A2 绩效管理									
		A201 绩效目标合理性	4.00	考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情		合理	通用标准	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权	根据《绩效目标表(2023年度)》①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得50%权重分;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得4.00分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				况				重分。		
		A202 绩效指标 明确性	3.00	考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况		明确	通用标准	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占20%权重分,要素②③各占40%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据《绩效目标表(2023年度)》①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得20%权重分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得40%权重分;③与项目目标任务数或计划数相对应,得40%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		A203 绩效监控有效性	3.00	考察项目是否开展绩效监控工作,用以反映和考核项目纠偏情况		有效	通用标准	①开展绩效监控工作;②是否对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”;③是否对偏离情况进行纠偏。若不符合要素①本指标不得分,要素②③各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据所提供的《项目资金支出绩效目标执行监控表》①开展绩效监控工作;②对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”,得50%权重分;③项目实施未发生偏离,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00
		A204 绩效自评规范性	4.00	考察项目是否开展绩效自评工作,用以反映和考核项目完成情况		规范	通用标准	①是否开展项目绩效自评工作;②绩效自评内容是否完整规范、权重设置合理等;③是否进行偏差原因分析。若不符合要素①本指标不得分,要素②③各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权	根据所提供的《绩效自评情况的报告》①开展项目绩效自评工作;②绩效自评为设置权重对各项指标进行打分,未对各指标完成情况进行打分,该项不得分;③对偏离情况进行偏差原因分析,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得50%权重分,得2.00分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								重分。		
	A3 资金投入									
		A301 预算编制科学性	3.00	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况		科学	通用标准	①项目具备预算编制相关资料;②预算编制经过科学论证;③预算内容与项目内容匹配;④预算额度测算依据充分,按照标准编制。要素①②③④各占25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,板桥镇2023年基层政权建设项目①项目具备预算编制相关资料,如《板桥镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目总投资估算审定表》,得25%权重分;②预算编制经过科学论证,得25%权重分;③预算内容与项目内容匹配,得25%权重分;④预算额度测算依据充分,按照标准编制,得25%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
B 过程										
	B1 资金管理									
		B101 资金到位率	3.00	考察项目资金实际到位情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%。	100%	通用标准	项目资金到位率达到目标值得满分。每偏离1%扣除权重分2%,扣完为止	板桥镇 2023 年基层政权建设项目预算批复 100 万元,实际到位资金 100 万元,资金到位率为 100%,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00
		B102 预算执行率	3.00	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率= (实际支出资金/实际预算到位资金) *100%;	100%	通用标准	项目资金预算执行率达到目标值得满分。每偏离1%扣除权重分2%,扣完为止。	板桥镇 2023 年基层政权建设项目预算批复 100 万元,实际到位资金 100 万元,实际支出 100 万元,预算执行率为 100%,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B103 资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况		合规	通用标准	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续。以上①②各占50%权重分,此项为一票否决项,若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项指标不得分。	根据提供的项目明细账及会计凭证,板桥镇2023年基层政权建设项目资金支付①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定,得50%权重分;②资金拨付有完整的审批程序和手续,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得4.00分。	4.00
	B2 组织实施									
		B201 项目管理制度健全性	2.00	项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施		健全	通用标准	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上两项中,要素①②各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据实地调研及资料核查,板桥镇①已制定相应的《财务管理办法》和相应的业务管理制度,得50%权重分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得2.00分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				的保障情况						
		B202 制度 执行 有效性	3.00	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况		有效	通用标准	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④落实项目法人制、招标投标制和监理制等。以上四项中,要素①②③④各占25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,板桥镇2023年基层政权建设项目实施①该项目存在先建后申请情况,该项不得分;②项目实施未发生调整,得25%权重分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得25%权重分;④落实项目法人制、招标投标制和监理制,得25%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得75%权重分,得2.25分。	2.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B203 政府 采购 规范 性	4.00	购买主体是否按照要求开展采购工作,用以反映和考核政府采购工作规范程度		规范	通用标准	①政府采购流程规范,集体决策资料齐全完整,时间逻辑清晰合理,符合相关规定和要求; ②按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效;③合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;合同价款结算时,财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对,按照合同约定付款等。以上四项	根据资料核查,板桥镇2023年基层政权建设项目先实施后进行政府采购,不符合评分标准,该指标不得分。	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								中，要素③占 50% 权重分，要素①② 各占 25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。		
C 产出										
	C1 产出数量									
		C101 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成	12.00	考察镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成情况		100%	计划标准	社会治安综合治理服务中心拆除镇社会治安综合治理服务中心墙面、门窗等装饰面 2200 m ² ；外墙面防水 400 m ² ，墙面喷刷涂料 1700 m ² ；室内装饰墙板 120 m ² 、吊顶 160 m ² 、喷刷涂料 130 m ² ；外立面浇筑框架檐口 750 m ² 。提升改造办公用房 50 间，粉刷墙	根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目①拆除墙面、门窗等装饰面计划实施 2200 平方米，实际实施 2203 平方米；②外墙面防水计划实施 400 m ² ，实际实施 425 m ² ；③墙面喷刷涂料计划实施 1700 m ² ，实际实施 1685 m ² ；④计划实施室内装饰墙板 120 m ² ，吊顶 160 m ² 、喷刷涂料 130 m ² ，实际实施室内装饰墙板 120 m ² ，吊顶 168 m ² 、喷刷涂料 130 m ² ；⑤外立面	9.00

一级指标	二级指标	三级指标情况	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								面 1500 m ² ; 安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套; 维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间; 维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设; 改造断桥隔热窗户 80 m ² 。实际建设内容与计划可研批复中计划建设内容相等得 100% 权重分, 每有一项不相符, 扣除 1 分, 扣完为止。	浇筑框架檐口计划实施 750 m ² , 实际实施 748 m ² ; ⑥ 计划安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套, 维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间, 实际安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套, 维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间; ⑦ 计划维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设 0 米, 实际维修改造电路、给排水管网及附属设施的更换架设 600 米; ⑧ 计划改造断桥隔热窗户 80 m ² , 实际实施 76.4 m ² 。其中②③⑦计划实施内容与实际实施内容相差较大, 依据评分标准扣 3 分, 该指标得 9.00 分。	
	C2 产出质量									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C201 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成验收合格情况	6.00	考察镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成验收合格情况		100%	计划标准	①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得20%权重分；②验收合格率达到100%，得80%权重分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据实地调研及资料核查，板桥镇2023年基层政权建设项目①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得20%权重分；②验收合格率达到100%，得80%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得6.00分。	6.00
	C3 产出时效									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C301 镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成及时情况	3.00	考察镇社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造项目完成及时情况		及时	计划标准	项目根据实施计划或实施方案按时完工得 100%权重分，未按计划不得分。	根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目按批复按时完工，得 100%权重分，得 3.00 分。	3.00
	C4 产出成本									
		C401 成本控制情况	4.00	考察项目的成本控制情况。	成本控制率=项目实际成本/项目预算批复数	≤ 100%	计划标准	控制率在 80%-100%之间得 100%权重分，每超出目标值 1%，扣除 10%权重分，扣完为止。若成本控制率低于 80%，每降	该项目投资预算 150 万元，实际成本支出 150 万元，该项目成本控制率为 100%，得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。		
D 效益										
	D1 社会效益									
		D101 办公环境提升性	6.00	考察项目完工投入使用后，工作人员办公环境是否得到提升		提升	通用标准	根据问卷分析，项目完工投入使用后，工作人员办公环境得到提升，酌情赋分。指标得分=满意率*指标权重分。	根据问卷分析，在本次调研的 18 位工作人员中，社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，认为办公效率是否提升，“明显提升”占“83.33%”，“有提升”占“16.67%”，“提升一般”占“0%”，“没有提升”占“0%”。依据评分标准，酌情扣分，该指标得 95%权重分，得 5.70 分	5.70
		D102 办公效率提升性	6.00	考察项目完工投入使用后，工作人员办公效率是		提升	通用标准	根据问卷分析，项目完工投入使用后，工作人员工作效率得到提升，酌情赋分。指标得分=	根据问卷分析，71 位受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作人员办事效率的满意度为 90.14%，依据评分标准，酌	5.41

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				否得到提升				满意率*指标权重分。	情扣分，该指标得 90.14%权重分，得 5.41 分	
		D103 群众安全感提升性	5.00	考察项目完工投入使用后，群众安全感是否得到提升		提升	通用标准	根据问卷分析，项目完工投入使用后，群众安全感得到提升，酌情赋分。指标得分=满意率*指标权重分。	根据问卷分析，71 位受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目维护与管理情况满意度为 91.56%，依据评分标准，酌情扣分，该指标得 90.56%权重分，得 4.58 分。	4.58
	D2 可持续影响									
		D201 长效管理机制健全性	4.00	对项目实施后建立的管理机制健全性、有效性进行评价		具备	行业标准	建立项目实施完工后后续管理机制，使得单位能够持续运行，避免出现只建不管情况，得 100%权重分，若未建立，不得分。	根据实地调研及资料核查，板桥镇 2023 年基层政权建设项目建设完工后建立了资产管理机制（包括登记备案、权属界定、日常管护）、监督管理机制（包括信息公开、审计监督、群众参与）等后续管理机制，使得单位能够持续运行，避免出现只建不管情况。该指标得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
	D3 服务对象满意度									
		D301 办事群众满意度	6.00	办事群众对项目实施产出、效益的满意程度		90%	调查问卷	得分=满意度*权重分，若满意度低于90%，每降低1%，扣除8%权重分，扣完为止。	根据问卷分析，入园幼儿家长对“临泽县西关幼儿园建设项目”满意度为91.83%，依据评分标准，该指标得91.83%，得5.51分。	5.51
		D302 工作人员满意度	6.00	考察单位工作人员对项目实施产出、效益的满意程度		90%	调查问卷	得分=满意度*权重分，若满意度低于90%，每降低1%，扣除8%权重分，扣完为止。	根据问卷分析，工作人员项目满意度为96.67%，依据评分标准，该指标得96.67%，得3.87分。	3.87

附件二 满意度报告

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目

受益群众满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目受益群众。

（二）调研方法

针对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（三）抽样方式

对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为 70 人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷 71 份。

（四）问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄、职业等信息。基本问题包括通过哪些渠道了解到临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的信息；您临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对板桥镇政府整体工作效果如何；工程实施后，板桥镇政府周围的环境卫生状况是否有改善；临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目是否对您的日常生活产生了积极影响。

2. 受访者的满意度调查

满意度调查主要考察临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后对改造后整体效果满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目维护与管理情况满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施效果、实施过程满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后对办事流程的满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作人员办事效率的整体评价。

3.受益群众的意见和建议

通过设立开放题，临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目受益群众有哪些意见和建议。

二、调查结果分析


（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 71 份，有效样本数为 71 份，有效率达 100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后受益群众中，男性 61 位，占 85.92%，女性 10 位，占 14.08%。

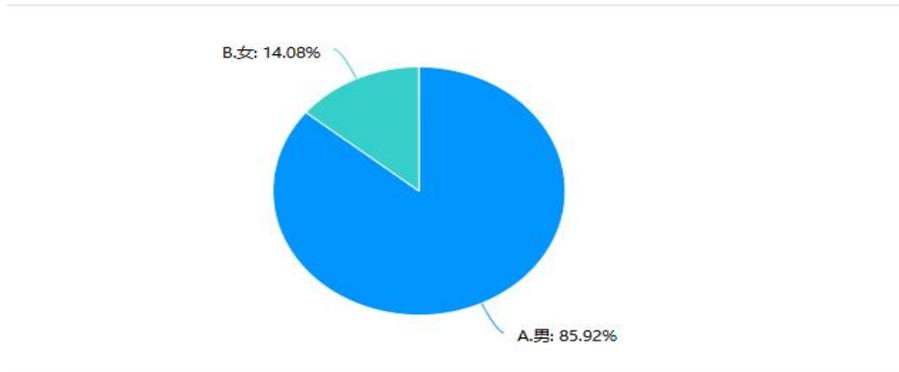

(2) 年龄

在本次调研临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后受益群众中，46 至 60 岁占多数。

(3) 职业

在本次调研临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后受益群众中，4 “务农” 占 “77.66%”，“” “外出务工” 占 “5.32%”，“个体经营” 占 “7.45%”，“学生” 占 “0%”，“其他” 占 “9.57%”。

选项+	小计+	比例
A. 务农	73	77.66%
B. 外出务工	5	5.32%
C. 个体经营	7	7.45%
D. 学生	0	0%
E. 其他 (请说明) [详细]	9	9.57%
本题有效填写人次	94	

2.基本问题

(1)您是通过哪些渠道了解到临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的信息

在本次调研的 71 位受益群众中，“社区公告” 的占 4.3%，“社交媒体/网络平台” 的 49.3%，“邻居/朋友告知” 的占 26.76%，“支付宣传册/活动” 的 90.14%，“其他” 的占 7.04%。

选项	小计	比例
A. 社区公告	39	54.93%
B. 社交媒体/网络平台	35	49.3%
C. 邻居/朋友告知	19	26.76%
D. 政府宣传册/活动	64	90.14%
E. 其他	5	7.04%
本题有效填写人次	71	

(2) 是否了解并参与临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对板桥镇政府整体工作效果如何

在本次调研的 71 位受益群众中，“非常有效，明显改善”占 73.24%，“较为有效，有一定改善”占 22.54%，“效果一般，变化不大”占 4.23%，“几乎无效，无改善”占 0%。

选项	小计	比例
A. 非常有效，明显改善	52	73.24%
B. 较为有效，有一定改善	16	22.54%
C. 效果一般，变化不大	3	4.23%
D. 几乎无效，无改善	0	0%
本题有效填写人次	71	

(3) 工程实施后，板桥镇政府周围的环境卫生状况是否有改善的信息

在本次调研的 71 位受益群众中，“显著改善”占 85.92%，“有所改善”占 11.27%，“基本不变”占 2.82%，“反而变差”占 0%。

选项	小计	比例
A. 显著改善	61	85.92%
B. 有所改善	8	11.27%
C. 基本不变	2	2.82%
D. 反而变差	0	0%
本题有效填写人次	71	

(4) 临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目是否对您的日常生活产生了积极影响

在本次调研的 71 位受益群众中，“是，影响很大”占 47.89%，“是，有一定影响”占 23.94%，“影响不大”占 9.86%，“没有影响”占 18.31%。

选项	小计	比例
A. 是，影响很大	34	 47.89%
B. 是，有一定影响	17	 23.94%
C. 影响不大	7	 9.86%
D. 没有影响	13	 18.31%
本题有效填写人次	71	

3.满意度分析

满意度调查主要考察临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施后受益群众对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目整体满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目项目效果满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目维护与管理情况满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施效果、实施过程满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目办事流程满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作人员办事效率的整体评价。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”，满分为 100%。各档次对应得分为 100%、80%、60%、30%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看，受益群众平均满意度达 91.83%。

分项来看，“对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目实施效果、实施过程满意度的整体评价”一项满意度最高，得分率达到 81.30%。“对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作人员办事效率的满意度的整体评价”一项满意度最低，为 90.14%。具体见下

图。

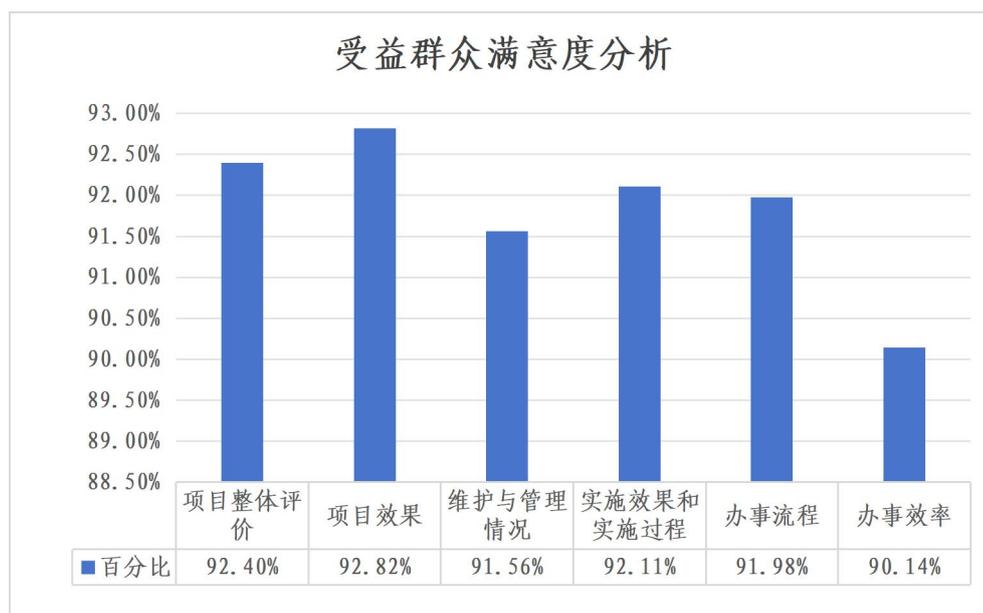


图 3-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，来搜集受益群众的意见和建议，现分类列示如下。

(1) 对以上问题不满意的有关方面

①办事效率需要进一步提升；

(2) 对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设工作还有哪些建议或意见

无

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理

工作人员满意度调查问卷报告

一、研究设计

(一) 调查对象

本次调研的对象为：临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员。

(二) 调研方法

针对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

(三) 抽样方式

本次问卷调查，抽取临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员样本量拟定为 15 份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷 18 份。

(四) 问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。包括调查对象从事的处室、工作年限等基本情况。

2. 受访者的满意度调查

包括对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作开展情况满意度的整体评价；对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目项目规划的科学与合理性满意度的整体评价；对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目新设施/设备的实用性满意度的整体评价；对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目项

目整体效果与预期目标达成满意度的整体评价;对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目施工质量满意度的整体评价。

3.受访者临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作的意见和建议

通过设立开放题，对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

(一) 满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 18 份，有效样本数为 18 份，有效率达 100%。有效问卷率影响了样本的代表性，从该指标上看本次调查具有统计意义。


1.调查对象的个人信息

(1) 所在股室

在本次调研管理相关工作人员，有 8 人属于办公室、4 人属于综治中心、1 人属于司法所、1 人属于农综中心、1 人属于应急办、3 人属于政务便民中心。

(2) 工作年限

工作年限为“1-2 年(含 2 年)”占“50%”，“2—5 年(含 5 年)”占“5.56%”，“5 年以上”占“44.44%”。



2.基本问题

(1) 社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，您认为办公效率是否提升

在本次调研的 18 位工作人员中，社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，您认为办公效率是否提升，“明显提升”占“83.33%”，“有提升”占“16.67%”，“提升一般”占“0%”，“没有提升”占“0%”。

选项	小计	比例
A. 明显提升	15	83.33%
B. 有提升	3	16.67%
C. 提升一般	0	0%
D. 没有提升	0	0%
本题有效填写人次	18	

(2) 您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对工作环境和办公设施改善的情况如何

在本次调研的 18 位工作人员中，对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对工作环境和办公设施改善的情况，认为“非常好”占“83.33%”，“比较好”占“16.67%”，“一般”占“0%”，“比较差”占“0%”。

选项	小计	比例
A. 非常好	15	83.33%
B. 比较好	3	16.67%
C. 一般	0	0%
D. 比较差	0	0%
本题有效填写人次	18	

(3) 您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对工作中的安全与健康保障有影响吗

在本次调研的 18 位工作人员中，认为“影响显著”占“72.22%”，“有影响”占“16.67%”，“影响一般”占“0.00%”，“没有影响”占“11.11%”。

选项	小计	比例
A. 影响显著	13	72.22%
B. 有影响	3	16.67%
C. 影响一般	0	0%
D. 没有影响	2	11.11%
本题有效填写人次	18	

(4) 您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

在本次调研的 18 位工作人员中，认为“合理”占“100%”，“不合理”占“0%”，“不清楚”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 合理	18	100%
B. 不合理	0	0%
C. 不清楚	0	0%
本题有效填写人次	18	

(5) 您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对整体环境提升有何帮助

在本次调研的 18 位工作人员中，认为“改善了工作环境的基础

设施条件”占“100%”，“丰富了变更场所的活动空间”占“88.89%”，“提升了办公场所的安全性”占“88.89%”，“美化了办公环境”占“83.33%”。

选项+	小计+	比例
(可多选)	1	5.56%
A.改善了工作的基础设施条件	18	100%
B.丰富了办公场所的活动空间	16	88.89%
C.提升了办公场所的安全性	16	88.89%
D.美化了办公环境	15	83.33%
本题有效填写人次	18	

3.满意度分析

本次问卷中的满意度问题有“对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作开展情况的满意程度”“对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目建设规划的科学性和合理性的满意程度”“对单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目新设施/设备的实用性的满意程度”“对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目整体效果与预期目标达成的满意程度”“对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目改造工程的施工质量的满意程度”。

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，根据临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员满意度的加权平均来看，临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理工作人员满意度达 97%。

分项来看：各项均分为 97%具体见图 3-1。




图 3-1 管理人员满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

(1) 对以上问题不满意的有关方面；

无

(2) 您对本单位项目工作还有哪些建议或意见。

无

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价 受益群众调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您的性别是？

A.男 B.女

2.您的年龄段是？

A.18 岁以下 B.18-30 岁 C.31-45 岁 D.46-60 岁 E.60 岁以上

3.您的职业：

A. 务农

B. 外出务工

C. 个体经营

D. 学生

E. 其他（请说明）_____

二、基本问题

1.通过社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，您认为工作人员办事效率是否提升？

A.明显提升 B.一般提升 C.提升 D.没有提升

2.您通过哪些渠道了解到临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的信息？

- A.社区公告 B.社交媒体/网络平台 C.邻居/朋友告知 D.政府宣传册/活动 E.其他

3.临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对板桥镇政府整体工作效果如何？

- A. 非常有效，明显改善
B. 较为有效，有一定改善
C. 效果一般，变化不大
D. 几乎无效，无改善

4.工程实施后，板桥镇政府周围的环境卫生状况是否有改善？

- A. 显著改善
B. 有所改善
C. 基本不变
D. 反而变差

5.临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目是否对您的日常生活产生了积极影响？

- A. 是，影响很大
B. 是，有一定影响
C. 影响不大
D. 没有影响

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目满意度的整体评价					
2.你对该项目实施对改善板桥镇整体效果满意度的整体评价					
3.您对该项目维护与管理情况的满意度的整体评价					
4.您对该项目实施效果、实施过程的满意度的整体评价					

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
5.您对于设施改造后您对办事流程的满意度的整体评价					
7.您对于工作人员办事效率的满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合! >

临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价 工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您目前所在的部门：_____

2.您在本单位工作的年限：（ ）

A. 1-2 年（含 2 年） B. 2-5 年（含 5 年） C. 5 年以上

二、基本问题

1.通过社会治安综合治理服务中心及办公用房维修改造，您认为办公效率是否提升？（ ）

A. 明显提升 B. 有提升 C. 提升一般 D. 没有提升

2.您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对工作环境和办公设施改善的情况如何（ ）

A. 非常好 B. 比较好 C. 一般 D. 比较差

3.您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对工作中的安全与健康保障有影响吗（ ）

A. 影响显著 B. 有影响 C. 影响一般 D. 没有影响

4.您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（ ）

- A. 合理 B. 不合理 C. 不清楚

5.您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目对整体环境提升有何帮助? ()
(可多选)

- A.改善了工作的基础设施条件
B.丰富了办公场所的活动空间
C.提升了办公场所的安全性
D.美化了办公环境

7.您认为临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目是否符合相关规定的验收标准 ()

- A. 是 B. 否 C. 不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对承建单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作开展情况的满意度的整体评价					
2.您对承建单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目规划的科学与合理性的满意度的整体评价					
3.您对承建单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目新设施/设备的实用性的满意度的整体评价					
4.您对承建单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目整体效果与预期目标达成的满意度的整体评价					
5.您对承建单位实施的临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目的施工质量满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县板桥镇 2023 年基层政权建设项目工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合! >

附件三 访谈报告

板桥镇 2023 年基层政权建设项目绩效评价访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

为进一步了解板桥镇 2023 年基层政权建设项目建设情况、财政资金使用情况为后续项目报告提供支撑，评价组对板桥镇 2023 年基层政权建设项目主要负责人开展访谈。

（二）访谈对象和访谈内容

1.访谈对象：项目负责人

2.访谈内容：主要包括，板桥镇 2023 年基层政权建设项目立项背景、项目实施的内容，项目立项申请、批复时间，预算申请、批复时间，项目资金的实际支付情况；板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金是如何进行测算的；项目的实施步骤和时间安排，包括前期调研、方案设计、施工建设、验收评估等阶段；项目实施期间是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥；板桥镇 2023 年基层政权建设项目完成后能够取得的成效有哪些（可从基层政权服务能力的提升、社会治理效率的提高、群众满意度的提升等方面谈起）等。

二、访谈分析

1.您谈一谈板桥镇 2023 年基层政权建设项目立项背景、项目实施的内容，项目立项申请、批复时间，预算申请、批复时间，项目资金的实际支付情况？

板桥镇 2023 年基层政权建设项目立项申请时间大概是 2022 年 6 月，在当月项目得到了批复；大概在 2023 年 5 月提交了预算申请，

在 9 月获得批复，项目资金一百万元在 12 月已实际支付。

2.请您谈一谈板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金是如何进行测算的？

板桥镇 2023 年基层政权建设项目资金是通过聘请甘肃大禹天成建设工程有限公司进行预算。

3.请您谈一谈项目的实施步骤和时间安排，包括前期调研、方案设计、施工建设、验收评估等阶段。

聘请甘肃浦帆项目有限公司做了项目的可行性研究报告。

4.请您谈一谈项目实施期间是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥。

项目实施期间通过以下几个方面进行了监督管理：一是在项目启动阶段，明确项目的目标和计划，确保项目能按照预期计划实施。二是设立监督机制，在项目执行过程中，通过设立监督机制来跟踪项目的进展，定期召开项目例会，进行项目进度和风险的评估，及时解决项目中的问题和障碍。三是定期进行项目评估，在项目执行过程中，通过定期的项目评估来对项目的进展、资源消耗、风险等进行评估和审查，及时发现问题，并采取相应的措施予以解决。

5.请您谈谈板桥镇 2023 年基层政权建设项目完成后能够取得的成效有哪些（可从基层政权服务能力的提升、社会治理效率的提高、群众满意度的提升等方面谈起）？

该项目的实施是加强基层政权建设的重要举措，通过该项目的实施，排除了存在的安全隐患，办公条件得到了极大的改善，提升了基层政权服务能力，提高了社会治理效率，方便了群众办事，群众满意度得到了提升，为推动全镇经济和社会各项事业的全面发展起到了积

极的促进作用。

6.请您谈一谈在板桥镇 2023 年基层政权建设项目运行过程中存在的困难或问题，并分析原因，以及下一步工作的安排与打算？

下一步，我镇将进一步发挥基层政权的职能，提升基层政权服务能力，提高社会治理效率，不断提高和改善农民的生活水平，巩固和加强基层政权建设。

附件四 基础信息表

表 1 板桥镇 2023 年基层政权建设项目计划实施情况表

填制单位 序号	项目名称	2023 年项目计划实施内容	2023 年项目实际完成内容	2023 年预算批复数 (万元)	2023 年实际到位资金数 (万元)	2023 年实际支出数 (万元)	备注
1	板桥镇 2023 年基层政权建设项目	主要建设内容涉及：拆除镇社会治安综合治理服务中心墙面、门窗等装饰面 2200 m ² ；外墙面防水 400 m ² ，喷刷涂料 1700 m ² ；室内装饰墙 120 m ² 、吊顶 160 m ² 、喷刷涂料 130 m ² ；外立面浇筑框架柱口 750 m ² 。提升改造办公室 50 间，粉刷墙面 1300 m ² ；安装独立卫生间、衣柜、书桌 50 套；维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间；维修改造化粪池 40 m ² ；维修改造化粪池及附属设施的更换架设；改造断桥隔热窗户 80 m ² 。	拆除墙面、门窗等装饰面 2203 m ² ；外墙面防水 425 m ² ，喷刷涂料 1685 m ² ；室内装饰墙 120 m ² ，吊顶 160 m ² ，喷刷涂料 130 m ² ；外立面浇筑框架柱口 748 m ² 。提升改造办公室 50 间，粉刷墙面 1500 m ² ；维修改造储物间 5 间、洗衣房 2 间；维修改造化粪池 40 m ² ；维修改造化粪池管网及附属设施的更换架设；改造断桥隔热窗户 76.4 m ² 。	100	100	100	自筹资金 50 万元。

表 2 基础数据取数表

填制单位（盖章）：

序号	实施内容	计划实施数	实际完成数	备注
1	拆除墙面、门窗等装饰面 (m ²)	2200	2203	
2	铺设外墙防水 (m ²)	400	425	
3	外墙粉刷 (m ²)	1700	1685	
4	室内装饰墙面板 (m ²)	120	120	
5	吊顶 (m ²)	160	160	
6	内墙粉刷 (m ²)	130	130	
7	外立面浇筑框架檐口 (m ²)	750	748	
8	办公用房墙面粉刷 (m ²)	1500	1500	
9	配套安装独立卫生间、衣柜、书桌 (套)	50	50	
10	维修改造储物间 (间)	5	5	
11	更换断桥隔热窗 (m ²)	80	76.4	
12	维修改造电路、上下水管网改造更换等	0	600 (m)	

(请添其余实施内容)

附件五 主评人资质证明

甘肃省财政厅 甘肃省人事厅 文件

甘财会〔2006〕33号

关于孔德瑞等 71 名同志具备高级 会计师职务任职资格的通知

各有关厅（局）、市（州）人事局、职改办：

经甘肃省会计专业高级职务任职资格评审委员会 2006 年 12 月 15 日会议评审通过，孔德瑞等 71 名同志具备高级会计师职务任职资格。现将名单通知如下，请予公布并通知本人。

一、兰州市 9 人

- 孔德瑞 兰州塑料工业总公司
- 刘虎前 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司
- 杨 梅 兰州市城市建设设计院
- 王灵蕙（企业有效） 兰州佛慈制药股份有限公司
- 赵祎玲 兰州市政建设集团有限责任公司
- 陈淑萍 兰州市热力公司筹建处

孙琦 兰州路博兰炼添加剂有限公司

仵宇庆 兰州科近泰基新技术有限责任公司

顾燕 兰州金慧伟业商贸有限公司

二、定西市 2人

孙维民 甘肃荣成会计师事务所

魏彩祥 定西市财政局

三、庆阳市 3人

张兴龙 庆阳市林业局

田锋 庆阳市财政学校

姚培俊 庆阳市非税收入管理局

四、临夏州 2人

赵淑丽 甘肃刘家峡水电联业有限公司

安涛 临夏州教育科学研究所

五、武威市 1人

谢荣胜 武威市粮食局

六、天水市 2人

丁子繁(小转大) 天水金桥房地产开发有限公司


罗小琴 天水市财政局

七、兰州市商业银行 1人

李军 兰州市商业银行

八、省委办公厅 1人

毕悦华 省委办公厅



九、省卫生厅 2 人

王国秀 甘肃省妇幼保健院

王 洁 省人民医院

十、省食品药品监督管理局 1 人

雷 虹 省药品检验所

十一、省人才交流开发服务中心 1 人

唐洪广 北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所

十二、省人事厅开发区人才资源管理处 1 人

何鹏举 甘肃励致会计师事务所有限公司

十三、省地质矿产勘查开发局 1 人

司一秀(单位有效) 省地质环境监测院

十四、省教育厅 4 人

曾潮洁 兰州交通大学财务处

刘梅芳 合作民族师范高等专科学校

赵云霞 兰州城市学院

段瑞祥(单位有效) 兰州城市学院

十五、省国家税务局 1 人

程国华 金昌市国家税务局第四分局

十六、甘肃建工集团 4 人

陈 毅 甘肃第一建筑工程有限责任公司

王晋洲 省建筑运输公司

王晋洲 省建筑运输公司

贺建林 甘肃第六建筑工程有限责任公司

十七、省林业厅 2 人

刘成玲 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局

孟丽萍(单位有效) 省林业厅三北防护林建设局

十八、省交通厅 3 人

黄利秀 省交通会计学会

杨建军 省交通科学研究所有限公司

罗富团 省交通厅

十九、省引洮水利水电开发有限责任公司 2 人

杨彪

张玮(企业有效)

二十、兰州长城电工股份有限公司 2 人

张岚 兰州长城电工股份有限公司

王家斌 天水二一三电器有限公司

二十一、省粮食局 5 人

郭伍宏 省粮食局

刘力宏 省粮食局

李莉 省粮食局景家店仓库

南兵 省粮食局打柴沟仓库

张尚琴(企业有效) 省粮食局白银植物油仓库

二十二、省新闻出版局 1 人

OO NOVO 7 5G (单位有效) 甘肃人民出版社
OO AI QUAD CAMERA

二十三、西北民族大学 1 人

黄建萍

二十四、兰州大学 1 人

卢晓雅 兰州大学科技广场

二十五、华龙证券有限责任公司 1 人

高 敏

二十六、中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 1 人

张红霞

二十七、兰石集团有限公司 1 人

徐建华

二十八、省国防科工办 2 人

张清阳 甘肃工业职业技术学院

庞长兰(兰外有效) 甘肃工业职业技术学院

二十九、省气象局 1 人

张晓玲

三十、省建设厅 1 人

冯春捷 省建设工程交易中心

三十一、窑街矿务局 2 人

李凤荣 窑街煤电公司资金结算中心

乔文斌(企业有效) 窑街煤电公司会计管理中心

三十二、省农垦集团有限责任公司 2 人

noVa 7 5G
AI QUAD CAMERA
甘肃农垦老农农场

何润芳 省农垦农工商联合总公司

三十三、省劳动和社会保障厅 1人

贾润泽(单位有效) 省社会保险事业管理局

三十四、长庆石油勘探局 2人

杜玉明 长庆石油勘探局钻井工程总公司

刘巨军 长庆石油勘探局钻井工程总公司

三十五、省审计厅 2人

胡明才 合盛会计师事务所


张 薇 省审计厅外资处

三十六、省地方税务局 1人

杨传红(单位有效) 兰州市七里河区地方税务局

三十七、省广播电影电视局 1人

马 达(单位有效) 省广播电影电视总台



二〇〇六年十二月十八日

主题词：会计 职称 通知

抄报：财政部、人事部

抄送：各有关单位

省财政厅 2006年12月19日印发

姓名 贺建林

性别 男

出生年月 1986.10

出生地点 _____

资格名称 高级会计师

资格级别 高级

评审时间 2006.12.15

评委会名称 福建省会计专业高级会计师评委会



持证人签名: 贺建林



主评人情况表

姓名	贺建林	单位	甘肃道瑞科技咨询有限公司	学历	大专
职称	高级会计师	职务	部门经理	拟在本项目任职	主评人
近五年内工作经历（近三年内绩效评价工作经历）					
时间	项目名称	项目概况			任职情况
2018年-2020年	江西洛钒股份公司担任财务总监	承担公司财务工作的把控和监督管理工作。			财务总监
2020年5月	甘肃省总工会“劳模补助”资金项目绩效评价	对2019年甘肃省总工会“劳模补助”资金项目的发放情况进行绩效评价。			项目总监
2020年8月	甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效评价	对2019年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门支出进行评价工作。			项目总监
2021年9月	甘肃省财政厅投资评审中心2020年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-省级公路建养资金	对2020年一般债券10亿元用于全省14个市州公路建设和养护绩效评价。			项目总监
	甘肃省财政厅投资评审中心2020年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-小型水库移民扶助基金	对小型水库移民扶助基金项目是根据水库移民后期扶持政策设立的，项目在水库移民遗留问题、改善库区及安置区居民的生产生活条件、保护移民权益、维护库区社会稳定方面。			项目总监
2022年3月	2016-2020年新农村现代流通服务网络建设资金“网上供销社”服务平台建设资金绩效评价服务项目	对全省66个“新网工程”工程项目，涉及全省13个市州、20个区县供销社和省供销集团10户直属企业及市县社属企业，项目资金共计6000万元。			主评人
2022年5月	2021年度省级部门绩效自评结果财政抽查复核工作	对20家省级部门单位21年度自评报告及自评表抽查复核。			项目总监
	2021年度市级预算执行情况财政重点绩效评价工作购买服务项目-部门整体评价	对金昌8个部门（民政局、公安局、招商局、商务局、司法局、自然资源局、政府办、文广旅）单位整体支出绩效评价。			主评人

2022年6月	甘肃省财政厅甘肃省县级财政运行综合绩效评价项目	对6个县区（甘谷县、康县、金塔县、甘州区、庄浪县、正宁县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
2022年8月	民政厅部门整体支出绩效评价项目	对甘肃省民政厅2021年部门重点项目及资金量大的项目进行绩效评价。	主评人
2022年9月	网络建设运维维护费项目支出绩效评价、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目支出绩效评价	对省公安厅网络建设运维维护费项目支出、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目进行绩效评价。	主评人
2023年5月	甘肃省财政厅县级财政运行综合绩效评价项目	对4个县区（张家川县、会宁县、合水县、泾川县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
	高标准农田建设项目绩效评价服务	对2022年度甘肃省高标准农田建设项目进行绩效评价，涉及资金3.16亿元。	主评人
2023年6月	青穗工程-困难家庭子女普通高校入学资助项目绩效评价服务	对共产主义青年团甘肃省委员会2022年青穗工程一困难家庭子女普通高校入学资助项目进行绩效评价，涉及预算金额8005.2万元。	主评人
