

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）

绩效评价报告

委托评价单位：临泽县财政局

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：临泽县西关幼儿园建设项目（专项
债券）

评价对象主体：临泽县西关幼儿园

评价报告时间：2024 年 9 月

摘 要

为强化部门资金绩效管理，提高资金使用效益，临泽县财政局委托甘肃道瑞科技咨询有限公司对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）开展重点绩效评价，报告摘要如下：

一、项目概况

为贯彻落实全国教育工作会议精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，积极发展学前教育，着力解决当前存在的“入园难”问题，满足适龄儿童入园需求，促进学前教育事业科学发展。各级政府充分认识发展学前教育的重要性和紧迫性，将大力发展学前教育作为贯彻落实教育规划纲要的突破口，作为推动教育事业科学发展的重要任务，作为建设社会主义和谐社会的重大民生工程，纳入政府工作重要议事日程，切实抓紧抓好。

近年来，临泽县始终以办好学前教育、实现幼有所育为目标全面实施“城乡幼儿园扩容增量、幼儿教师培训、幼儿园质量提升、幼儿园标准化建设”四大工程，着力解决群众关心的“入园难”“入园贵”等热点难点问题，积极构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，初步形成了“公办园为引领、附属园为骨干、民办园为补充”的多元化办园格局，学前教育呈现出财政投入持续增加、办园结构不断优化、办园规模日益扩大、教师队伍逐步加强、保教水平和普及程度持续提高的良好态势。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**91.86**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价结果等

级为：优。

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价总体得分情况

序号	指标名称	权重	得分	得分率
1	决策	23.00	21.40	93.04%
2	过程	24.00	20.14	83.92%
3	产出	27.00	24.60	91.11%
4	效益	26.00	25.71	98.88%
总分		100.00	91.85	91.85%

三、项目主要经验及做法

（一）儿童为本，创设游戏化的三养三润环境

一是精心筹划，打造属于幼儿自己的农耕园。二是教师根据课程开展采用多种形式创设班级、楼道环境，以匠心施彩，以爱心跟随，与幼儿共构、共创班级游戏环境。三是在活动室区域中投入了丰富的低结构、半成品、操作性强的材料，功能室的材料也逐步丰富。

（二）悦读润心，开展“西宝悦读乐园”活动

将早期阅读有机融合在主题教育之中，各班根据幼儿年龄特点选择优秀绘本图书，约定“故事时间”，用贴画、盖印章、贴小红旗等多种方式打卡记录，争当“阅读小明星”；每周五进行“图书漂流”，幼儿把自己喜欢的书借回家和爸爸妈妈一起“亲子共读”。

（三）传承传统文化，开展丰富的主题活动

一是开展“温情三月与爱相伴”亲子活动，家长和幼儿一起进行亲子制作让幼儿在感受爱的陪伴的同时懂得用更多方式去表达爱，付出爱。二是举办“乐享春耕 播种希望”春耕节活动。三是开展“清明节”“端午节”“母亲节”等主题活动。四是举办学前教育宣传月主题文艺汇演，将幼儿艺术成果以经典颂唱、舞蹈、情景剧、戏曲、器

乐等节目形式把科学保教的理念传递给师幼和家长。五是举办童年如画，筑梦启航”幼儿创客作品展示，诚挚邀请家长携手幼儿步入创意乐园，共同见证幼儿艺术探索之路的璀璨启程。六是将“非遗”请进校园，开启“非遗文化寻觅之旅”快乐游园，通过直接感知、动手体验、实践操作等方式，让幼儿体验“面塑”“泥塑”“京剧变脸”“扎染”“编织”等活动的乐趣，领略非遗文化之美。七是举行“我的快乐我做主”美食品享活动，增强幼儿的责任意识、感恩情怀，帮助幼儿形成勤俭节约优良品质。八是组织大中班小朋友到西关小学开展丰富多彩的幼小衔接活动，切实推进幼小双向衔接、科学衔接、有效衔接。

四、存在的问题

（一）未按期归还利息，影响资金流动性

根据临泽县财政局与临泽县教育局签署《甘肃省地方政府专项债券还本付息协议》，临泽县西关幼儿园付息应该为每年3月27日、9月27日。但根据评价发现，2023年临泽县西关幼儿园付息时间为12月28日，未按协议付息。

五、有关建议

（一）加强沟通与协调，优化财务管理

一是及时沟通，单位应与财政部门保持密切沟通，及时通报项目进展和资金状况，确保财政部门了解项目实际情况和还款能力；二是协商解决方案，在发现还款困难时，单位应与财政部门协商制定延期还款、分期还款等灵活的还款方案，以减轻短期还款压力；三是加强预算管理，单位应加强预算管理，合理安排资金使用，确保专项债利息的偿还资金得到优先保障；四是设立偿债准备金，推动设立专项债

券偿债准备金，根据专项债务余额规模定期多渠道、多形式筹集资金补充偿债准备金，用于增加债券还本付息保障，降低偿债资金不足风险。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 主要内容	2
(三) 绩效目标	4
(四) 项目实施情况	5
(五) 资金投入	6
(六) 资金使用情况	6
二、评价基本情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 评价原则及标准	6
(三) 评价方法	8
(四) 绩效评价指标体系	10
(五) 绩效评价组织过程	12
三、综合评价结论及分析	14
(一) 综合评价情况及评价结论	14
(二) 指标完成情况	15
1.决策情况(23分)(-1.6分)	15
2.过程情况(24分)(-3.86分)	18
3.项目产出(27分)(-2.4分)	21
4.项目效益(26分)(-0.29分)	23
四、项目主要经验及做法	25
(一) 儿童为本,创设游戏化的三养三润环境	25
(二) 悦读润心,开展“西宝悦读乐园”活动	25
(三) 传承传统文化,开展丰富的主题活动	26
五、存在的问题	26
(一) 未按期归还利息,影响资金流动性	26

六、有关建议27

 （一）加强沟通与协调，优化财务管理27

七、需要说明的问题27

八、有关附件27

附件一 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）评分表28

附件二 满意度报告50

附件三 访谈报告70

附件四 基础信息表76

附件五 主评人资质证明79

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。改革开放特别是新世纪以来，我国学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但总体上看，学前教育仍是各级各类教育中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”问题突出。办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。

党的十八大明确提出：要在 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标。教育事业在全面建成小康社会中，具有基础性、先导性、全面性的重要作用。享受教育权利和接受良好教育是社会主义制度下的广大人民群众最基本的需求和最根本的利益。另外，贫困地区贫困的原因之一就是劳动者的技术水平低，背后的原因就是受教育水平低，因此，治穷必治愚。面对日益激烈的市场竞争和知识经济时代的挑战，接受良好教育不仅已经成为人们生存发展的第一需要和终身受益的财富，甚至决定其一生的命运。因此，只有加快教育改革与发展，不断满足人民群众接受高质量教育和终身学习的要求，才能符合广大人民群众的根本利益。

甘肃省委、省政府高度重视学前教育工作，抓住发展机遇期，全面实施学前教育三年行动计划，先后出台了《甘肃省人民政府关于加

快学前教育改革与发展的意见》《甘肃省学前教育三年行动计划（2011-2013年）》《甘肃省学前教育五年发展规划（2011-2015年）》等政策文件，有力促进了全省学前教育事业的快速发展。截至2013年底，全省共有幼儿园3141所，在园幼儿54.98万人，分别比2010年增加734所和16.25万人，学前教育改革发展取得显著成效；全省公办幼儿园达到1613所，民办幼儿园达到1528所，分别比2010年增加了405所和329所，学前教育资源快速扩大，公办、民办并举的格局基本形成；学前教育投入保障机制初步建立，省、市、县三年累计投入28.69亿元用于实施学前教育重大项目；幼儿园专任教师达到20621人，比2010年增加6953人，教师补充渠道逐步拓宽，幼儿教师数量得到扩充；学前三年毛入园率达到66.15%，比2010年提高了26.47个百分点，适龄儿童入园难的问题初步缓解。

临泽县始终以办好学前教育、实现幼有所育为目标，全面实施“城乡幼儿园扩容增量、幼儿教师培训、幼儿园质量提升、幼儿园标准化建设”四大工程，着力解决群众关心的“入园难”“入园贵”等热点难点问题，积极构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，初步形成了“公办园为引领、附属园为骨干、民办园为补充”的多元化办园格局，学前教育呈现出财政投入持续增加、办园结构不断优化、办园规模日益扩大、教师队伍逐步加强、保教水平和普及程度持续提高的良好态势。

（二）主要内容

临泽县西关幼儿园总用地面积12000.10 m²，新建教学楼主体三层，总建筑面积5034.14 m²，其中：一层建筑面积1629.45 m²，设有晨检厅、隔离室、保健观察室、衣帽间、寝室活动室、餐厅、卫生间、

办公室、洗衣室、值班室、消控室、配电室、备餐间、操作间、主副食库房、消洗间等；二层建筑面积 1657.32 m²，寝室活动室、衣帽间、卫生间、盥洗室、办公室、美工室、构件室、美工室、储物间、民间工艺体验坊、科学探究室等；三层建筑面积 1657.32 m²，三层设有寝室活动室、衣帽间、卫生间、盥洗室、办公室、音乐教室、会议室、生活体验馆、绘本馆等；屋面建筑面积为 90.05 m²，主要为出屋面楼梯间及水箱间。

教学楼共 3 层，总建筑面积 5034.14 m²（1 层建筑面积 1629.45 m²，2 层建筑面积 1657.32 m²，3 层建筑面积 1657.32 m²，屋面建筑面积 90.05 m²），占地面积 1629.45 m²，南北坐向，东西长 60.80m，南北宽 50.00m，呈“L”形布置，建筑总高度 17.75m，一层层高 4.50m，二层层高 4.20m，三层层高 4.20m，出屋面楼梯间及水箱间层高 4.20m，室内外高差 0.65m，结构形式为框架结构，建筑耐久等级二级、抗震等级二级、建筑耐火等级为二级，工程抗震设防烈度为 8 度，设计地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第三组，建筑抗震设防类别乙类，屋面防水等级为 II 级，室内环境污染控制类别：I 类，设计合理使用年限为 50 年。

新建门卫室设计为值班室，门卫室主体一层，总建筑面积 36.55 m²，主要设有接待值班室、休息室、卫生间；建筑物总长 29.82m（含电动门及附属建筑），宽 4.20m，出屋面装饰部分建筑高度 6.05m，建筑门卫室主体高度 3.75m，室内外高差 0.45m。建筑耐久等级二级、抗震等级二级、建筑耐火等级为二级，工程抗震设防烈度为 8 度，建筑抗震设防类别丙类，屋面防水等级为 II 级，设计合理使用年限为 50 年。

新建砖垛铁艺围墙 466.00m，墙高 2.1m，墙厚 0.40m，均清水墙砖砌结构，结构抗震等级为二级。

室外附属工程主要为规划范围内的室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、化粪池、消防水池、箱变等建筑安装工程。

（三）绩效目标

1.社会效益

随着临泽县经济社会的快速发展，城镇化进程和人口集聚的进一步加快，以及外来人口的增加，幼教资源紧缺与需求的矛盾日益突出，已很难满足人们对优质教育、均衡教育的迫切要求。项目实施后，可以填补该区域幼儿园空白的城市现状，还可以有效提升该地块的土地利用率。教学规模达到 12 个教学班、360 名在校学生的办学规模，建立健全各功能室，达到设备设施较齐全，功能完善，完全可以满足办学需求。

本项目建成后可达到《城市幼儿园建筑面积定额（试行）》，的要求，可解决周围足龄幼儿的入园问题。将极大缓解了临泽县学前教育就学压力，对促进临泽县教育事业和经济发展有着现实和历史的重要意义。

2.经济效益

临泽县西关幼儿园的建设没有直接的经济效益。但是，通过项目的实施能较好地解决临泽县 360 名幼儿学前教育的问题，使临泽县幼教布局更合理，让幼儿能就近入园，其家长能安心搞好生产和工作。对经济建设和社会发展做出贡献，产生间接效益。同时为夯实基础教育、巩固“普九”工作打下坚实的基础，为提高临泽县人口的文化和

科学素质，振兴当地经济建设和社会发展，将起到积极的促进和推动作用。

预算项目支出绩效目标表（2023 年）

申报单位名称:	临泽县西关幼儿园		
一级项目名称:	地方专项债券	二级项目名称:	临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）
项目类型:	新增项目	项目分类:	专项工作经费
项目资金（万元）:	1000	本年预算金额（万元）:	1000
年度绩效目标	计划 5 月底完成主体封顶，7 月份主体工程完工，室内装饰装修分项进行，预计十月份工程完工		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	项目控制价	=2025.91 万元
产出指标	数量指标	增加园位	≥ 306 个
	质量指标	工程质量达标率	100.00%
	时效指标	工程完工及时性	及时
效益指标	经济效益指标	不断扩大学前教育优质资源覆盖面	不断提升
	社会效益指标	满足邻近小区及周边适龄幼儿入园	基本满足
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 90%

（四）项目实施情况

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）是县列 2023 年 115 个重点项目之一，项目于 2022 年 8 月开工建设，截至目前该项目已完工验收投入运营。

（五）资金投入

本项目总投资 3190.26 万元，其中：工程费用 2473.24 万元，占总投资的 77.53%，工程建设其他费用 565.10 万元，占总投资的 17.71%，基本预备费 151.92 万元，占总投资的 4.76%。

（六）资金使用情况

截至 2024 年 8 月，板桥镇 2023 年基层政权建设项目实际支出 2474 万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）。评价的时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

资金范围：项目资金共计 2474 万元。

（二）评价原则及标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）进行客观、公正的绩效评价。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价标准

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准

本次评价过程中广泛使用计划标准，将临泽县财政局临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）年初预算编制的绩效目标申报表，与绩效监控运行表、绩效自评报告以及自评表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，考察项目建设是

否如期完成年度预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

（2）行业标准

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

（3）历史标准

参照临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）及西关幼儿园往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对临泽县西关幼儿园工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

（4）其他标准

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根

据项目实际情况抉择）。

1.成本效益分析法

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）进行重点评价，考察项目成本与效益是否匹配。

2.比较法

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

3.因素分析法

通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

4.最低成本法

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

5.公众评判法

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与临泽县财政局（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）情况的客观评价，具体问卷调查详见附件满意度分析报告，具体访谈详见附件访谈报告。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量及产出质量情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.项目决策

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

2.项目过程

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查

看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途,是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效,主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合,是否完成计划实施的全部内容,项目质量是否达到要求,有无超支情况,项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查,一是对对应合同规定的项目内容进行评价,对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进行考评;二是根据相关验收标准,对项目实施质量进行评价。

4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度,主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核,通过问卷调查及评价组实地调研,核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在 90(含)-100 分的,绩效评级为优;得分在 80(含)-90 分的,绩效评级为良;得分在 60(含)分-80 分的,绩效评级为中;得分在 60 分以下的,绩效评级为差,评价指标体系简表如下,详细的评价指标体系见附件一。

表 2-1 临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)绩效评价指标体系(简表)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分
		A102 立项程序规范性	3.00	规范
	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理
		A202 绩效指标明确性	4.00	明确
		A203 绩效监控有效性	2.00	有效
		A204 绩效自评规范性	4.00	规范
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3.00	科学
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%
		B102 预算执行率	2.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
		B103 资金管理情况	4.00	纳入、匹配、执行
		B104 资金使用合规性	3.00	合规
		B105 专项债券本息偿还计划执行情况	4.00	及时足额
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	3.00	健全
		B202 制度执行有效性	2.00	有效
		B203 政府采购规范性	3.00	规范
C 产出	C1 产出数量	C101 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成情况	8.00	100%%
		C102 征地拆迁补助完成情况	4.00	80%
	C2 产出质量	C201 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工程验收情况	5.00	100%
		C201 征地拆迁补助发放覆盖率	2.00	100%
	C3 产出时效	C301 泽县西关幼儿园建设项目完工及时性	4.00	及时
		C302 征地拆迁补助发放及时性	2.00	及时
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	2.00	≤ 100%
	D 效益	D1 社会效益	D101 学前教育普及率	2.00
D102 就业提升性			3.00	提升
D103 促进教育资源平衡性			3.00	平衡
D104 推进学前教育发展水平			3.00	推进
D105 投诉整改情况			2.00	0
D2 可持续影响		D201 长效管理机制健全性	3.00	具备
D3 服务对象满意度		D301 入园幼儿家长满意度	6.00	-
		D302 工作人员满意度	4.00	-
合计			100.00	-

（五）绩效评价组织过程

1.前期调研

根据临泽县财政局 2024 年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。

3.数据采集

本次绩效评价调研工作评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：
一是资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；**二是**评价组对所收集调查问卷受益群众 126 份进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及

满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4.报告撰写

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**91.86**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价结果等级为：优。

总体认为：临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成较好，一是提升学前教育质量，新建的西关幼儿园配备现代化的教育设施和教学资源，为孩子们提供更加优质、安全、舒适的学习环境。有助于提升该区域学前教育的整体质量，促进幼儿身心健康发展。二是增加学位供给，项目完工后，新增一定数量的幼儿园学位，有效缓解周边区域适龄幼儿的入园压力，让更多的孩子有机会接受学前教育，保障

他们受教育的权利。三是优化教育资源配置，作为临泽县的重点建设项目之一，西关幼儿园的建设促进全县教育资源的优化配置，推动学前教育事业的均衡发展。

（二）指标完成情况

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效管理情况进行分析评价。

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价总体得分情况如下图所示：

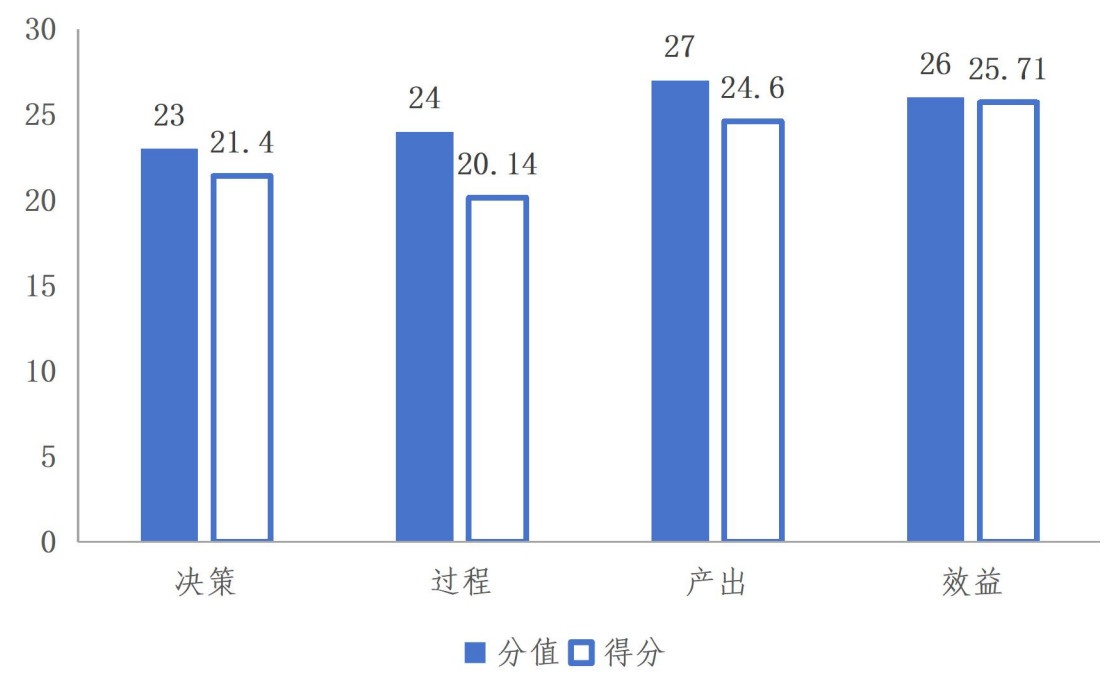


图 3-1 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价总体得分情况

1.决策情况（23 分）（-1.6 分）

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）决策维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-1 决策维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分	3.00
		A102 立项程序规范性	3.00	规范	3.00

	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理	4.00
		A202 绩效指标明确性	4.00	明确	4.00
		A203 绩效监控有效性	2.00	有效	2.00
		A204 绩效自评规范性	4.00	规范	2.40
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3.00	科学	3.00
合计			23.00	-	21.40

（1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目立项符合《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》《甘肃省人民政府关于加快学前教育改革与发展的意见》等发展规划和相关政策，得 33.3%权重分；②项目立项符合中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》相关政策要求，得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A102 立项程序规范性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目按照规定的程序申请设立，得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，得 33.3%权重分；③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

（2）绩效管理

“A201 绩效目标合理性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《预算项目支出绩效目标表（2023 年度）》①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实

际工作内容具有相关性，得 50%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“A202 绩效指标明确性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《预算项目支出绩效目标表（2023 年度）》①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 20%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 40%权重分；③指标与项目目标任务数、计划数相对应，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“A203 绩效监控有效性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《项目绩效运行监控报告》《项目支出绩效目标运行监控表》①开展绩效监控工作；②对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，得 50%权重分；③对偏离情况进行纠偏，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。

“A204 绩效自评规范性”指标分值 4.00 分，得分 2.40 分。

根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）专项债券项目资金绩效自评报告》《项目支出自评表》①开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容，完整规范，但自评表中一是未对项目实际完成情况进行分析，二是无指标权重分，只有得分，扣 40%权重分，得 10%权重分；③指标无偏差，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 60%权重分，得 2.40 分。

（3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目具备预算编制相关资料，如《项目总投资估算表》《工程建设其他费用估算投资表》等；②预算编制经过科学论证，得 20%权重分；③预算内容与项目内容匹配，得 20%权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 20%权重分；⑤项目申请专项债券额度与实际匹配，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

2.过程情况（24 分）（-3.86 分）

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-2 过程维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%	1.14
		B102 预算执行率	2.00	100%	2.00
		B103 资金管理情况	4.00	纳入、匹配、执行	4.00
		B104 资金使用合规性	3.00	合规	3.00
		B105 专项债券本息偿还计划执行情况	4.00	及时足额	2.00
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	3.00	健全	3.00
		B202 制度执行有效性	2.00	有效	2.00
		B203 政府采购规范性	3.00	规范	3.00
合计			24.00	-	20.14

（1）资金管理

“B101 资金到位率”指标分值 3.00 分，得分 1.14 分。

根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）预算批复数 3154.47 万元，实际到位资金 2474 万元，到位率为 78.43%，该指标得 56.86%权重分，得 1.14 分。

“B102 预算执行率”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）申请专项债 1000 万元，实际到位 1000 万元，截至 2023 年年底，该笔资金全部支出，资金执行率为 100%，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。

“B103 资金管理情况”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，得 20%权重分；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，得 20%权重分；③专项债券期限与项目期限匹配，得 20%权重分；④项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“B104 资金使用合规性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据核查项目明细账及会计凭证，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）资金支出①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定，得 30%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，得 30%权重分；③符合专项债券规定的用途，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B105 专项债券本息偿还计划执行情况”指标分值 4.00 分，得分 2.00 分。

根据核查项目明细账及会计凭证，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①未按《甘肃省地方政府债券还本付息协议》中约定付息频率还息，考核要素不得分；②专项债券本息按照计划额度足额偿

还本息，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 50%权重分，得 2.00 分。

（2）组织实施

“B201 项目管理制度健全性”指标分值 XX 分，得分 XX 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①制定相应的财务和业务管理制度，如《临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理制度》《临泽县西关幼儿园财务管理制度》《临泽县西关幼儿园专项资金管理制度》，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B202 制度执行规范性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①遵守《临泽县城总体规划》（2010-2030）、《张掖市人民政府关于大力促进学前教育改革发展的意见》等相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目未发生调整，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分；④落实项目法人制、招投标制和监理制，得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。

“B203 政府采购规范性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，得 25%权重分；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效，得 25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致；按合同

规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

3.项目产出（27 分）（-2.4 分）

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-3 产出维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
C 产出	C1 产出数量	C101 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成情况	8.00	100%%	5.60
		C102 征地拆迁补偿完成情况	4.00	80%	4.00
	C2 产出质量	C201 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工程验收情况	5.00	100%	5.00
		C201 征地拆迁补偿发放覆盖率	2.00	100%	2.00
	C3 产出时效	C301 泽县西关幼儿园建设项目完工及时性	4.00	及时	4.00
		C302 征地拆迁补偿发放及时性	2.00	及时	2.00
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	2.00	≤ 100%	2.00
	合计		27.00	-	24.60

（1）产出数量

“C101 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成情况”指标分值 5.60 分，得分 8.00 分。

根据资料及基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①该项目教学楼建设共计三层，总建筑面积符合可研批复中计划建筑面积，1 层建筑面积 1629.45 m²，2 层建筑面积 1657.32 m²，3 层

建筑面积 1657.32 m²，屋面建筑面积 90.05 m²，得 50%权重分；②新建门卫室总建筑面积计划 36.55 m²，实际验收建设面积 36.55 m²，得 30%权重分；③计划新建砖垛铁艺围墙 466.00 米，墙高 2.1 米，实际验收新建砖垛铁艺围墙 186.00 米，墙高 2.01 米，与研批复中计划建设面积不等，该项不得分。综上所述，依据评分标准，该指标得 70%权重分，得 5.60 分。

“C102 征地拆迁补偿完成情况”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据基础数据核查，征地拆迁补偿应发放数 185.91 万元，征地拆迁补偿实际发放数 185.91 万元，征地拆迁补偿款发放完成率为 100%。该指标得 80%权重分，得 4.00 分。

(2) 产出质量

“C201 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工程验收情况”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得 20%权重分；②验收合格率达到 100%，得 80%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 5.00 分。

“C201 征地拆迁补偿发放覆盖率”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）征地拆迁补偿应发放人数 111 人，征地拆迁补偿应实际发放人数 111 人，覆盖率为 100%，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。

(3) 产出时效

“C301 泽县西关幼儿园建设项目完工及时性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）根据实施计划及实施方案按时完工，得 100%权重分，得 4.00 分。

“C302 征地拆迁补偿发放及时性”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）征地拆迁补偿按时发放，得 100%权重分，得 2.00 分。

（4）产出成本

“C401 成本控制情况”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）预算批复 2025.91 万元，项目实际成本 2025.04 万元，成本控制率为 99.96%，得 100%权重分，得 2.00 分。

4.项目效益（26 分）（-0.29 分）

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）效益维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-4 效益维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
D 效益	D1 社会效益	D101 学前教育普及率	2.00	99.91%	2.00
		D102 就业提升性	3.00	提升	3.00
		D103 促进教育资源平衡性	3.00	平衡	2.94
		D104 推进学前教育发展水平	3.00	推进	2.95
		D105 投诉整改情况	2.00	0	2.00
	D2 可持续影响	D201 长效管理机制健全性	3.00	具备	3.00
	D3 服务对象满意度	D301 入园幼儿家长满意度	6.00	-	5.90
		D302 工作人员满意度	4.00	-	3.92

合计	26.00	-	25.71
----	-------	---	-------

（1）社会效益

“D101 学前教育普及率”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据基础数据表，临泽县西关幼儿园本区域符合入园条件幼儿数 197 人，截至 2024 年幼儿入学时间，实际入园幼儿数 197 人，学前教育实现高普及率为 100%，得 100%权重分，得 2.00 分。

“D102 就业提升性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据基础数据表，临泽县西关幼儿园开园后增加幼师 20 人，保安 1 人，厨师 3 人，保洁 1 人，该项目投入运行后增加就业，得 100%权重分，得 3.00 分。

“D103 促进教育资源平衡性”指标分值 3.00 分，得分 2.94 分。

通过满意度调查问卷分析，对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）规划的科学性与合理性的满意度为 98%，得 98%权重分，得 2.94 分。

“D104 推进学前教育发展水平”指标分值 3.00 分，得分 2.95 分。

通过满意度调查问卷分析，受益群众对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对教学质量（包括教师水平、教学内容和方法）的满意度为 98.41%，得 98%权重分，得 2.95 分。

“D105 投诉整改情况”指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。

根据基础数据核查，未发生幼儿入园后家长投诉情况，得 100%权重分，得 2.00 分。

（2）可持续影响

“D201 长效管理机制健全性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）投入运行后，建立后续管理机制，且制定《临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理制度》《临泽县西关幼儿园财务管理制度》《临泽县西关幼儿园专项资金管理制度》等制度，使得幼儿园能够持续运行，得 100%权重分，得 3.00 分。

（3）服务对象满意度

“D301 入园幼儿家长满意度”指标分值 6.00 分，得分 5.90 分。

根据问卷分析，入园幼儿家长对“临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）”满意度为 98.31%，依据评分标准，该指标得 98.31%，得 5.90 分。

“D302 工作人员满意度”指标分值 4.00 分，得分 3.92 分。

根据问卷分析，工作人员对“雪亮工程”项目满意度为 98%，依据评分标准，该指标得 98%，得 3.92 分。

四、项目主要经验及做法

（一）儿童为本，创设游戏化的三养三润环境

一是精心筹划，打造属于幼儿自己的农耕园。幼儿园农耕园目前栽种蔬菜、水果，中药材等 40 余种，在美化幼儿园环境的同时为幼儿观察植物生长，体验劳动、开展课程打好了基础。二是教师根据课程开展采用多种形式创设班级、楼道环境，以匠心施彩，以爱心跟随，与幼儿共构、共创班级游戏环境。三是在活动室区域中投入了丰富的低结构、半成品、操作性强的材料，功能室的材料也逐步丰富。

（二）悦读润心，开展“西宝悦读乐园”活动

将早期阅读有机融合在主题教育之中，各班根据幼儿年龄特点选择优秀绘本图书，约定“故事时间”，用贴画、盖印章、贴小红旗等

多种方式打卡记录，争当“阅读小明星”；每周五进行“图书漂流”，幼儿把自己喜欢的书借回家和爸爸妈妈一起“亲子共读”。开展以“红孩子读经典红色基因代代传”为主题的红色绘本宣讲活动。

（三）传承传统文化，开展丰富的主题活动

一是开展“温情三月与爱相伴”亲子活动，家长和幼儿一起进行亲子制作让幼儿在感受爱的陪伴的同时懂得用更多方式去表达爱，付出爱。二是举办“乐享春耕 播种希望”春耕节活动，孩子们在丰富多彩的活动中了解中国二十四节气文化，体验劳动快乐。三是开展“清明节”“端午节”“母亲节”等主题活动。四是举办学前教育宣传月主题文艺汇演，将幼儿艺术成果以经典颂唱、舞蹈、情景剧、戏曲、器乐等节目形式把科学保教的理念传递给师幼和家长。五是举办童年如画，筑梦启航”幼儿创客作品展示，诚挚邀请家长携手幼儿步入创意乐园，共同见证幼儿艺术探索之路的璀璨启程。六是将“非遗”请进校园，开启“非遗文化寻觅之旅”快乐游园，通过直接感知、动手体验、实践操作等方式，让幼儿体验“面塑”“泥塑”“京剧变脸”“扎染”“编织”等活动的乐趣，领略非遗文化之美。七是举行“我的快乐我做主”美食品享活动，增强幼儿的责任意识、感恩情怀，帮助幼儿形成勤俭节约优良品质。八是组织大中班小朋友到西关小学开展丰富多彩的幼小衔接活动，切实推进幼小双向衔接、科学衔接、有效衔接。

五、存在的问题

（一）未按期归还利息，影响资金流动性

根据临泽县财政局与临泽县教育局签署《甘肃省地方政府专项债券还本付息协议》，临泽县西关幼儿园付息应该为每年3月27日、9

月 27 日。但根据评价发现，2023 年临泽县西关幼儿园付息时间为 12 月 28 日，未按协议付息。专项债项目通常涉及大量资金，未按时支付利息可能导致项目资金流动性紧张，影响项目的正常推进和后续建设。

六、有关建议

（一）加强沟通与协调，优化财务管理

一是及时沟通，单位应与财政部门保持密切沟通，及时通报项目进展和资金状况，确保财政部门了解项目实际情况和还款能力；二是协商解决方案，在发现还款困难时，单位应与财政部门协商制定延期还款、分期还款等灵活的还款方案，以减轻短期还款压力；三是加强预算管理，单位应加强预算管理，合理安排资金使用，确保专项债利息的偿还资金得到优先保障；四是设立偿债准备金，推动设立专项债券偿债准备金，根据专项债务余额规模定期多渠道、多形式筹集资金补充偿债准备金，用于增加债券还本付息保障，降低偿债资金不足风险。

七、需要说明的问题

无。

八、有关附件

附件一 2023 年老旧小区改造项目评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础信息表

附件五 主评人资质证明

附件一 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
A 决策										
	A1 项目立项									
		A101 立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况		充分	行业标准	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合部门相关政策要求；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中，要素①②③各占 33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目立项符合《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》《甘肃省人民政府关于加快学前教育改革与发展的意见》等发展规划和相关政策，得 33.3%权重分；②项目立项符合中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》相关政策要求，得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
									权支出责任划分原则，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。	
		A102 立项程序规范性	3	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		规范	通用标准	①项目按照规定的程序申请设立；②项目立项审批文件、材料符合相关要求；③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策等。以上三项中，要素①②③各占	根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目按照规定的程序申请设立，得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，得 33.3%权重分；③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	该指标得 100%权重分，得 3.00 分。	
	A2 绩效管理									
		A201 绩效目标合理性	4	考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况		合理	通用标准	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《预算项目支出绩效目标表（2023 年度）》①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 50%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		A202 绩效指标明确性	4	考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况		明确	通用标准	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占 20%权重分,要素②③各占 40%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)《预算项目支出绩效目标表(2023 年度)》①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 20%权重分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得 40%权重分;③指标与项目目标任务数、计划数相对应,得 40%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 4.00 分。	4.00
		A203 绩效监控有效性	2	考察项目是否开展绩效监控工作,用以反映和考核项目纠偏情况		有效	通用标准	①开展绩效监控工作;②是否对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”;③是否对偏离情况进行纠偏。若不符合要素①本指标不得分,要素②③各占 50%权重	根据临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)《项目绩效运行监控报告》《项目支出绩效目标运行监控表》①开展绩效监控工作;②对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”,得 50%权重分;③对偏离情况进行纠偏,得 50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	权重分，得 4.00 分。	
		A204 绩效自评规范性	4	考察项目是否开展绩效自评工作,用以反映和考核项目完成情况		规范	通用标准	①是否开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容是否完整规范、权重设置合理等；③是否进行偏差原因分析。若不符合要素①本指标不得分，要素②③各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）《临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）专项债券项目资金绩效自评报告》《项目支出自评表》①开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容，完整规范，但自评表中一是未对项目实际完成情况进行分析，二是无指标权重分，只有得分，扣 40%权重分，得 10%权重分；③指标无偏差，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 60%权重分，得 2.40 分。	2.40
	A3 资金投入									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		A301 预算编制科学性	3	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况		科学	通用标准	①项目具备预算编制相关资料;②预算编制经过科学论证;③预算内容与项目内容匹配;④预算额度测算依据充分,按照标准编制;⑤项目申请专项债券额度与实际匹配程度。不符合要素①该项指标不得分,要素②③④各占20%权重分,⑤占40%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①项目具备预算编制相关资料,如《项目总投资估算表》《工程建设其他费用估算投资表》等;②预算编制经过科学论证,得20%权重分;③预算内容与项目内容匹配,得20%权重分;④预算额度测算依据充分,按照标准编制,得20%权重分;⑤项目申请专项债券额度与实际匹配,得40%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00
B 过程										
	B1 资金管理									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B101 资金到位率	3	考察项目资金实际到位情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%。	100%	通用标准	项目资金到位率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止	根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)预算批复数 3154.47 万元，实际到位资金 2474 万元，到位率为 78.43%，该指标得 56.86% 权重分，得 1.14 分。	1.71
		B102 预算执行率	2	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率= (实际支出资金/实际预算到位资金) *100%;	100%	通用标准	项目资金预算执行率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。	根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)申请专项债 1000 万元，实际到位 1000 万元，截至 2023 年年底，该笔资金全部支出，资金执行率为 100%，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B103 资金管理情况	4	考察项目资金纳入政府性基金预算管理,资金支付与项目建设进度匹配情况以及还本付息情况		纳入、匹配、执行	计划标准	①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理;②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配;③专项债券期限与项目期限匹配;④项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配。以上考核要素①②③各占 20%权重分,④各占 40%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理,得 20%权重分;②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配,得 20%权重分;③专项债券期限与项目期限匹配,得 20%权重分;④项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配,得 40%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B104 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况		合规	通用标准	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③符合专项债券规定的用途。以上①②各占 30% 权重分,③占 40% 权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。此项为一票否决项,若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项指标不得分。	根据核查项目明细账及会计凭证,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)资金支出①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定,得 30%权重分;②资金拨付有完整的审批程序和手续,得 30%权重分;③符合专项债券规定的用途,得 40%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B105 专项债券本息偿还计划执行情况	4	考察专项债券的本息偿还是否与计划一致,用于反映和考核专项债券本息偿还计划的实际执行情况		及时足额	计划标准	①专项债券本息按照规定的时间进行偿还;②专项债券本息按照计划额度足额偿还本息。以上要素各占 50%权重分,符合则得分,不符合扣除相应权重分。	根据核查项目明细账及会计凭证,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①未按《甘肃省地方政府债券还本付息协议》中约定付息频率还息,考核要素不得分;②专项债券本息按照计划额度足额偿还本息,得 50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 50%权重分,得 2.00 分。	2.00
	B2 组织实施									
		B201 项目管理制度健全性	3	项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施		健全	通用标准	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上两项中,要素①②各占 50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①制定相应的财务和业务管理制度,如《临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)管理制度》《临泽县西关幼儿园财务管理制度》《临泽县西关幼儿园专项资金管理制度》,得 50%权重分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得 50%权重分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				的保障情况					重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。	
		B202 制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况		有效	通用标准	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④落实项目法人制、招标投标制和监理制等。以上四项中,要素①②③④各占 25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权	根据资料核查,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①遵守《临泽县城总体规划》(2010-2030)、《张掖市人民政府关于大力促进学前教育发展的意见》等相关法律法规和相关管理规定,得 25%权重分;②项目未发生调整,得 25%权重分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得 25%权重分;④落实项目法人制、招标投标制和监理制,得 25%权重分。综上所述,依据评分标准,该指	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								重分。	标得 100%权重分，得 2.00 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B203 政府采购 规范性	3	购买主体是否按照要求开展采购工作,用以反映和考核政府采购工作规范程度		规范	通用标准	①政府采购流程规范,集体决策资料齐全完整,时间逻辑清晰合理,符合相关规定和要求; ②按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效;③合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;合同价款结算时,财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核	根据资料核查,临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)①政府采购流程规范,集体决策资料齐全完整,时间逻辑清晰合理,符合相关规定和要求,得 25%权重分;②按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效,得 25%权重分;③合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;合同价款结算时,财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对,按照合同约定付款,得 50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								对，按照合同约定付款等。以上四项中，要素③占 50% 权重分，要素①②各占 25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。		
C 产出										
	C1 产出数量									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C101 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成情况	8	考察临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成情况		1000%	计划标准	①教学楼建筑完成情况，教学楼共3层，总建筑面积5034.14 m ² （1层建筑面积1629.45 m ² ，2层建筑面积1657.32 m ² ，3层建筑面积1657.32 m ² ，屋面建筑面积90.05 m ² ），实际建筑面积与计划可研批复中计划建设面积相等得40%权重分，不符合，不得分；②新建门卫室总建筑面积36.55 m ² ，实际建筑面积与计划可研批复中计划建设面积相等得30%权重分，不符合，不得分；③新建砖垛铁艺围墙	根据资料及基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①该项目教学楼建设共计三层，总建筑面积符合可研批复中计划建设面积，1层建筑面积1629.45 m ² ，2层建筑面积1657.32 m ² ，3层建筑面积1657.32 m ² ，屋面建筑面积90.05 m ² ，得50%权重分；②新建门卫室总建筑面积计划36.55 m ² ，实际验收建设面积36.55 m ² ，得30%权重分；③计划新建砖垛铁艺围墙466.00米，墙高2.1米，实际验收新建砖垛铁艺围墙186.00米，墙高2.01米，与研批复中计划建设面积不等，该项不得分。综上所述，依据评分标准，该指标得70%权重分，得5.60分。	5.60

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								466.00 米，墙高 2.1，实际建筑面积与计划可研批复中计划建设面积不符合，不得分。		
		C102 征地拆迁 补助完成 情况	4	本项目建设需征 地约 18 亩，待 征土地性质为 建设用地及耕 地，补偿方式 为货币补偿， 合计约 288 万 元。考察征地 拆迁补助完成 情况	征地拆迁补 偿款发放完成 率=实际发放 数/应发放数	80%	计划标准	计划完成率达 到 80%得相应 权重分，每偏 离目标值 1%， 扣除 5%权重分 ，扣完为止。	根据基础数据 核查，征地拆 迁补助应发放 数 185.91 万 元，征地拆迁 补助实际发放 数 185.91 万 元，征地拆迁 补偿款发放完 成率为 100% 。该指标得 80 %权重分，得 4.00 分。	4.00
	C2 产出质量									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C201 临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工程验收情况	5	考察临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）完成验收情况。	验收合格率=验收合格数量/完工数量	100%	通用标准	①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得 20%权重分；②验收合格率达到 100%，得 80%权重分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据资料核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）①项目完工后及时完成项目完工验收工作，得 20%权重分；②验收合格率达到 100%，得 80%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 5.00 分。	5.00
		C201 征地拆迁补偿发放覆盖率	2	考察征地拆迁补偿发放是否发放到位。	覆盖率=实际发放人数/应发放人数	100%	计划标准	发放覆盖率达到 100%的 100%权重分，每偏离 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）征地拆迁补偿应发放人数 111 人，征地拆迁补偿应实际发放人数 111 人，覆盖率为 100%，该指标得 100%权重分，得 2.00 分。	2.00
	C3 产出时效									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C301 泽县西关幼儿园建设项目完工及时性	4	考察临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)是否按计划及时完工(工期: 2021年6月—2023年6)		及时	计划标准	泽县西关幼儿园建设项目根据实施计划或实施方案按时完工得 100%权重分, 未按计划不得分。	根据资料核查, 临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)根据实施计划及实施方案按时完工, 得 100%权重分, 得 4.00 分。	4.00
		C302 征地拆迁补偿发放及时性	2	考察征地拆迁补偿发放是否及时。		及时	计划标准	征地拆迁补偿发放根据实施计划或实施方案按时发放得 100%权重分, 未按计划不得分。	根据资料核查, 临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)征地拆迁补偿按时发放, 得 100%权重分, 得 2.00 分。	2.00
	C4 产出成本									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C401 成本控制情况	2	考察项目的成本控制情况。	成本控制率=项目实际成本/项目预算批复数	≤ 100%	计划标准	控制率在80%-100%之间得100%权重分，每超出目标值1%，扣除10%权重分，扣完为止。若成本控制率低于80%，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据基础数据核查，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）预算批复2025.91万元，项目实际成本2025.04万元，成本控制率为99.96%，得100%权重分，得2.00分。	2.00
	D1 社会效益									
		D101 学前教育普及率	2	考察学前教育实现高普及率（学前三年毛入园99.91%）。	学前教育实现高普及率=入园幼儿数/本区域符合入园条件幼儿数	99.91%	计划标准	学前教育实现高普及率达到目标值得满分，每降低1%，扣除10%权重分，扣完为止。	根据基础数据表，临泽县西关幼儿园本区域符合入园条件幼儿数197人，截至2024年幼儿入学时间，实际入园幼儿数197人，学前教育实现高普及率为100%，得100%权重分，得2.00分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		D102 就业提升性	3	考察临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)投入运行后增加就业情况。		提升	通用标准	考察临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)投入运行后增加就业,例如幼师、保安、保洁、厨师等。	根据基础数据表,临泽县西关幼儿园开园后增加幼师 20 人,保安 1 人,厨师 3 人,保洁 1 人,该项目投入运行后增加就业,得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00
		D103 促进教育资源平衡性	3	通过满意度调查问卷情况,反映项目的实施对社会效益的影响程度。		平衡	通用标准	通过满意度调查问卷,反映区域学前教育资源分布的效果。指标得分=满意率*指标权重分。	通过满意度调查问卷分析,对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)规划的科学性与合理性的满意度为 98%,得 98%权重分,得 2.94 分。	2.94
		D104 推进学前教育水平	3	通过评价项目后推进区域学前教育水平,反映社会效益的实现		推进	通用标准	通过满意度调查问卷,反映推进学前教育发展水平效果情况,酌情赋分。指标得分=满意率*指标权重分。	通过满意度调查问卷分析,受益群众对临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)实施后对教学质量(包括教师水平、教学内容和方法)的满意度为 98.41%,得 98%权重分,得 2.95 分。	2.95

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				程度。						
		D105 投诉 整改 情况	2	对老旧小区改造后是否接到居民投诉情况进行评价。		0	通用标准	①未发生幼儿入园后家长投诉情况，未发生得 100%权重分；②发生投诉及时整改，整改率达到 100%，得 40%，每偏离 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据基础数据核查，未发生幼儿入园后家长投诉情况，得 100%权重分，得 2.00 分。	2.00
	D2 可持续影响									
		D201 长效 管理机制 健全性	3	对项目实施后建立的管理机制健全性、有效性进行评价		具备	行业标准	建立项目实施完工后后续管理机制，使得幼儿园能够持续运行，避免出现只建不管情况，得 100%权重分，若未	临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）投入运行后，建立后续管理机制，且制定《临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理制度》《临泽县西关幼儿园财务管理制度》《临	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								建立，不得分。	泽县西关幼儿园专项资金管理制度》等制度，使得幼儿园能够持续运行，得 100%权重分，得 3.00 分。	
	D3 服务对象满意度									
		D301 入园幼儿家长满意度	6	考察入园幼儿家长对项目实施产出、效益的满意程度			调查问卷	得分=满意度*权重分	根据问卷分析，入园幼儿家长对“临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）”满意度为 98.31%，依据评分标准，该指标得 98.31%，得 5.90 分。	5.90
		D302 工作人员满意度	4	考察单位工作人员对项目实施产出、效益的满意程度			调查问卷	得分=满意度*权重分	根据问卷分析，工作人员对“雪亮工程”项目满意度为 98.26%，依据评分标准，该指标得 98.26%，得 3.93 分。	3.93

附件二 满意度报告

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）受益群众满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）受益群众。

（二）调研方法

针对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（三）抽样方式

对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为 120 人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷 126 份。

（四）问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄等信息。基本问题包括是否了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）；您通过哪些渠道了解到临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的信息；幼儿园的建设对社区有哪些积极影响；幼儿园在哪些方面对孩子帮助最大。

2. 受访者的满意度调查

满意度调查主要考察临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实

施后受益群众对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对新增或改善的教学设施的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对安全设施和措施是否让您感到放心的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对教学质量（包括教师水平、教学内容和方法）的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对环境卫生的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园与您沟通孩子的学习和生活情况方面的整体评价。

3.受益群众的意见和建议

通过设立开放题，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）受益群众有哪些意见和建议。

二、调查结果分析


（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 126 份，有效样本数为 126 份，有效率达 100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后受益群众中，男性 25 位，占 19.84%，女性 101 位，占 80.16%。



(2) 年龄

在本次调研临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后受益群众中，31 至 45 岁占多数。

选项	小计	比例
A.18岁以下	4	3.17%
B.18-30岁	55	43.65%
C.31-45岁	64	50.79%
D.46-60岁	3	2.38%
E.60岁以上	0	0%
本题有效填写人次	126	

2.基本问题

(1) 是否有 3-6 岁的幼儿需要入园

在本次调研的 126 位受益群众中，“有”的占 97.62%，“没有”的 2.38%。

选项	小计	比例
A.有	123	97.62%
B.没有	3	2.38%
本题有效填写人次	126	

（2）如何得知该幼儿园建设项目的

本次调研的 126 位受益群众中，“社区公告”占 7.14%，“亲朋好友告知”占 5.56%，“社交媒体/网络平台”占 1.59%，“政府宣传册/活动”占 74.6%，“其他”占 11.11%。

选项	小计	比例
A. 社区公告	9	7.14%
B. 亲朋好友告知	7	5.56%
C. 社交媒体/网络平台	2	1.59%
D. 政府宣传册/活动	94	74.6%
E. 其他	14	11.11%
本题有效填写人次	126	

（3）幼儿园的建设对社区有哪些积极影响

在本次调研的 126 位受益群众中，“提升了区域学前教育资源”占 97.62%，“缓解了入园难的问题”占 86.51%，“提高了教育质量”占 92.06%，“促进了教育公平”占 86.51%，“改善了社区环境”占 84.92%。

选项	小计	比例
A. 提升了区域学前教育资源	123	97.62%
B. 缓解了入园难的问题	109	86.51%
C. 提高了教育质量	116	92.06%
D. 促进了教育公平	109	86.51%
E. 改善了社区环境	107	84.92%
F. 其他, 请说明: [详细]	0	0%
本题有效填写人次	126	

（4）对该幼儿园的教学环境、设施配置满意

在本次调研的 126 位受益群众中，“非常满意”占 93.65%，“满意”占 4.76%，“一般”占 0.79%，“不满意”占 0.79%“未了解过”占 0%。

选项	小计	比例
A. 非常满意	118	93.65%
B. 满意	6	4.76%
C. 一般	1	0.79%
D. 不满意	1	0.79%
E. 未了解过	0	0%
本题有效填写人次	126	

（5）您认为幼儿园在哪些方面对孩子帮助最大

在本次调研的 126 位受益群众中，认为“社交能力”占 94.44%，
“学习能力”占 94.44%， “生活习惯培养”占 95.24%， “兴趣爱好
发掘”占 92.06%， “其他”占 0%。

选项	小计	比例
A. 社交能力	119	94.44%
B. 学习能力	119	94.44%
C. 生活习惯培养	120	95.24%
D. 兴趣爱好发掘	116	92.06%
E. 其他，请说明: [详细]	0	0%

3.满意度分析

满意度调查主要考察临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后受益群众对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对新增或改善的教学设施的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对安全设施和措施的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对教学质量（包括教师水平、教学内容和方法）的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后对环境卫的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）实施后是否经常与您沟通孩子的学习和生活情况的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专

项债券)实施后对推进区域学前教育发展水平效果的满意度的整体评价。每项指标的满意度分为五档,即“非常满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”,满分为100%。各档次对应得分值为100%、80%、60%、30%、0%,通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看,受益群众平均满意度达98.31%。

分项来看,“对临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)实施后项目整体满意度的整体评价”,“临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)实施后对推进区域学前教育发展水平效果的满意度的整体评价”两项满意度最高,得分率达到98.57%。“对临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)实施过程中环境卫生的满意度的整体评价”一项满意度最低,为97.78%。具体见下图。

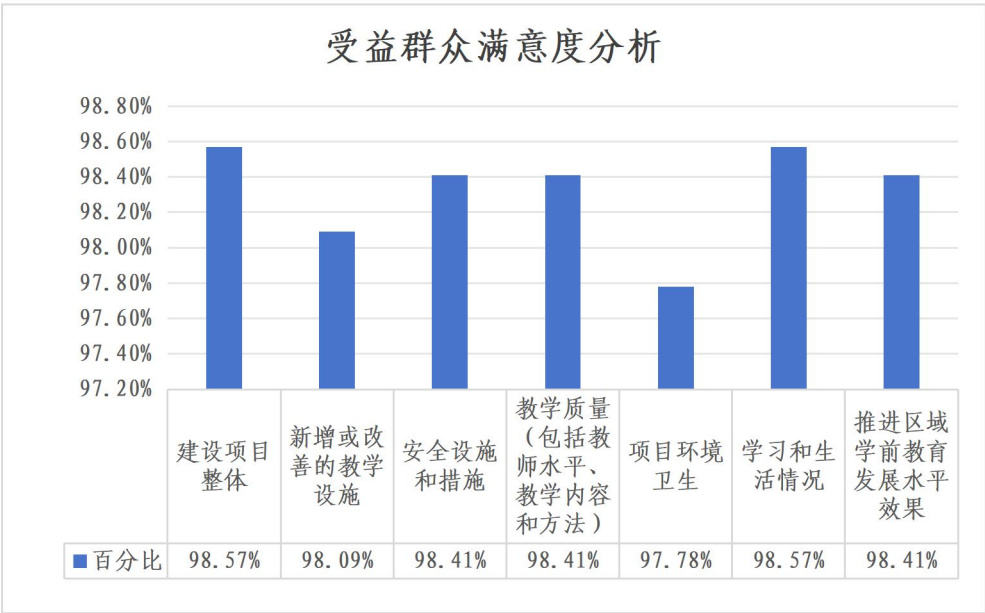


图 3-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答,来搜集受益群众的意见和建议,现分类列示如下。

(1) 对以上问题不满意的有关方面

①教室卫生间味道太重。小朋友的吃饭和睡觉都在教室进行。需要加大清洁力度;

(2) 对西关幼儿园建设项目工作还有哪些建议或意见

①多关注心理素质提升;

②伙食改善;

③加强同家长沟通联系。

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员。

（二）调研方法

针对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

（三）抽样方式

本次问卷调查，抽取临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员样本量拟定为 20 份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷 23 份。

（四）问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。包括调查对象从事的班级、工作年限等基本情况。

2. 受访者的满意度调查

包括对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作的满意度的整体评价；对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）支出等方面资金分项目规划的科学性与合理性的满意度的整体评价；对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）新设施/设备的满意度的整体评价；对临泽县西关幼儿园建设项目（专项

债券)整体效果与预期目标达成的满意度的整体评价。

3.受访者临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)工作的意见和建议

通过设立开放题,对临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)管理人员有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

(一)满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 23 份,有效样本数为 23 份,有效率达 100%。有效问卷率影响了样本的代表性,从该指标上看本次调查具有统计意义。


1.调查对象的个人信息

(1)所在班级

在本次调研管理相关工作人员,有 9 人属于大班、5 人属于小班、8 人属于小班、1 人属于幼儿园、1 人属于管理岗。

(2)工作年限

工作年限为“1-2 年(含 2 年)”占“30.43%”,“2—5 年(含 5 年)”占“8.7%”,“5 年以上”占“60.87%”。



2.基本问题

（1）是否清楚临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的主要内容

在本次调研的 23 位工作人员中，是否清楚临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的主要内容，“非常清楚”占 91.3%，“比较清楚”占 8.7%，“一般”占“0%”，“不清楚”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 非常清楚	21	 91.3%
B. 比较清楚	2	 8.7%
C. 一般	0	 0%
D. 不清楚	0	 0%
本题有效填写人次	23	

（2）临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）对教学设施、教学水平改善的情况如何


在本次调研的 23 位工作人员中，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）对教学设施、教学水平改善的情况如何，“非常好”占“95.65%”，“比较好”占“4.35%”，“一般”占“0%”，“比较差”占 0%。

选项	小计	比例
A. 非常好	22	 95.65%
B. 比较好	1	 4.35%
C. 一般	0	 0%
D. 比较差	0	 0%
本题有效填写人次	23	

（3）临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）对所在区域教育事业和经济发展有影响


在本次调研的 23 位工作人员中，对所在区域教育事业和经济发展有影响，认为“影响显著”占“91.3%”，“有影响”占“8.7%”，

“影响一般”占“0%”，“比较差”占“没有影响%”，“非常差”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 影响显著	21	 91.3%
B. 有影响	2	 8.7%
C. 影响一般	0	 0%
D. 没有影响	0	 0%
本题有效填写人次	23	


（4）临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）是否符合相关规定的验收标准

在本次调研的 13 位工作人员中，认为“是”占“92.3%”，“否”占“7.69%”，“不清楚”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 是	12	 92.31%
B. 否	0	 0%
C. 不清楚	1	 7.69%
本题有效填写人次	13	


（5）临泽县西关幼儿园项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

在本次调研的 23 位工作人员中，对资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，认为“合理”占“100%”，“不合理”占“0%”，“不清楚”占“0%”。

选项	小计	比例
A. 合理	23	 100%
B. 不合理	0	 0%
C. 不清楚	0	 0%
本题有效填写人次	23	

（6）临泽县西关幼儿园项目的建设能否缓解附近片区学前教育就学入园的压力

在本次调研的 23 位工作人员中，对能否缓解附近片区学前教育就学入园的压力，认为“能”占“100%”，“一般”占“0%”，“缓解部分压力”占“0%”，“不能”占“0%”。

选项	小计	比例
A. 能	23	 100%
B. 一般	0	 0%
C. 缓解部分压力	0	 0%
D. 不能	0	 0%
本题有效填写人次	23	

3.满意度分析

本次问卷中的满意度问题有“对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作开展情况的满意程度”“对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）项目规划的科学性与合理性的满意程度”“对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）新设施/设备的实用性的满意程度”“对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）项目整体效果与预期目标达成的满意程度”“对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）符合相关规定的验收标准的满意程度”。

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，根据临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员满意度的加权平均来看，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）管理人员满意度达 98%。

分项来看：“对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）开展情况的满意度的整体评价”，“对单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）规划的科学性与合理性的满意度的整体评

价”得分率达到 98%。具体见图 3-1。




图 3-1 管理人员满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集临泽县西关幼儿园建设项目(专项债券)管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

(1) 对以上问题不满意的有关方面；

无

(2) 您对幼儿园建设工作还有哪些建议或意见。

无

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价受益群众调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您的性别是？

A.男 B.女

2.您的年龄段是？

A.18 岁以下 B.18-30 岁 C.31-45 岁 D.46-60 岁 E.60 岁以上

3.您家中是否有 3-6 岁的幼儿需要入园？

A.有 B.没有

二、基本问题

1.您是否参与过该项目的意见征询或相关活动？

A. 是 B. 否

2.您是如何得知该幼儿园建设项目的？

A. 社区公告 B. 亲朋好友告知 C. 社交媒体/网络平台
D.政府宣传册/活动 E.其他

3.您认为该幼儿园的建设对社区有哪些积极影响？（可多选）

A. 提升了区域学前教育资源
B. 缓解了入园难的问题

- C. 提高了教育质量
- D. 促进了教育公平
- E. 改善了社区环境
- F. 其他，请说明：_____

4.您对该幼儿园的教学环境、设施配置满意吗？

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 未了解过

5.如果您家中有幼儿已在该幼儿园就读，您认为幼儿园在哪些方面对孩子帮助最大？（可多选）

- A. 社交能力
- B. 学习能力
- C. 生活习惯培养
- D. 兴趣爱好发掘
- E. 其他，请说明：_____

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的满意度的整体评价					
2. 您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）新增或改善的教学设施的满意					
3.您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的安全设施和措施是否让您感到放心的满意度的整体评价					
4.您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的教学质量（包括教师水平、教学内容和方法）的满意度的整体评价					

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
5.您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）环境卫生的满意度的整体评价					
6.您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）是否经常与您沟通孩子的学习和生活情况的满意度的整体评价					
7.您对于临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）推进区域学前教育发展水					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合！>

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您目前所在的年级/班级：_____

2.您在本单位工作的年限：（ ）

A. 1-2 年（含 2 年） B. 2-5 年（含 5 年） C. 5 年以上

二、基本问题

1.您是否清楚临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的主要内容（ ）

A. 非常清楚 B. 比较清楚 C. 一般 D. 不清楚

2.您认为临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）对教学设施、教学水平改善的情况如何（ ）

A. 非常好 B. 比较好 C. 一般 D. 比较差

3.您认为临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）对所在区域教育事业和经济发展有影响吗（ ）

A. 影响显著 B. 有影响 C. 影响一般 D. 没有影响

4.您认为临泽县西关幼儿园项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（ ）

A. 合理 B. 不合理 C. 不清楚

5.您认为临泽县西关幼儿园项目的建设能否缓解附近片区学前教育就学入园的

压力（ ）

A. 能 B. 一般 C. 缓解部分压力 D. 不能

6.您认为临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）建设对幼儿园的整体环境提升有何帮助？（ ）

（可多选）

A.改善了教学的基础设施条件

B.丰富了幼儿活动空间

C.提升了幼儿园的安全性

D.美化了校园环境

E.其他，请具体说明：_____

7.您认为临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）是否符合相关规定的验收标准（ ）

A. 是 B. 否 C. 不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作开展情况的满意度的整体评价					
2.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）规划的科学与合理性的满意度的整体评价					
3.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）新设施/设备的实用性的满意度的整体评价					
4.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）项目整体效果与预期目标达成的满意度的整体评价					

5.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）的施工质量满意度的整体评价					
6.您对承建单位实施的临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）效果与影响的满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合！>

附件三 访谈报告

临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）绩效评价访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

为进一步了解临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）建设情况、财政资金使用情况为后续项目报告提供支撑，评价组对临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）主要负责人开展访谈。

（二）访谈对象和访谈内容

1.访谈对象：项目负责人

2.访谈内容：主要包括，临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）中的预算情况和整体支出情况；临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）中资金是如何进行测算的；对于分配的资金使用情况是如何监管的；对于分配的资金使用情况是如何监管的；在项目开展的过程中与承建单位如何做到协调工作开展以及质量保障的；临泽县西关幼儿园建设项目（专项债券）是如何进行征地拆迁补助发放的（包括但不限于发放人数、发放标准等）；临泽县西关幼儿园投入运行后是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥；西关幼儿园投入运行后增加了多少就业人员，通过何种方式进行招聘任用的。

二、访谈分析



临泽县西关幼儿园建设项目访谈提纲

一、您谈一谈临泽县西关幼儿园建设项目中的预算情况和整体支付情况。

西关幼儿园建设规划总投资 3154.47 万元，主体工程（临泽县西关幼儿园建设项目）经财政局评审中心评审招标控制价 2025.91 万元，中标价 2025.04 万元；内部装饰工程招标控制价 227 万元，中标价 226.73 万元。2022 年至 2023 年项目预算资金 2474 万元，到位 2474 万元，其中：学前教育发展专项补助资金 1454 万元，专项债券 1000 万元，教育费附 20 万元。至 2024 年 1 月幼儿园建设项目共完成支付 2474 万元，其中主体工程款支付 1850 万元（含 1000 万元专项债券资金），室内装饰工程款支付 206.30 万元，待摊费用 84.45 万元，设备购置 313.25 万元，绿化项目 20 万元。

二、请您谈一谈临泽县西关幼儿园建设项目资金是如何进行测算的；对于分配资金使用情况是如何监管的。

幼儿园建设项目中的资金是以中标价测算的，分配的资金根据工程量情况审核审批后，经财政国库集中支付全部支付到施工方账户，每次支付时按 3、7 比例，将 30%工程款直接支付到施工方农民工工资专户。

三、您认为在项目开展的过程中与承建单位如何做到协调工作开展以及质量保障的？

1. 加强工程管理，严格落实责任。成立项目建设领导小组和

招标、机构设置、监督、施工现场监管等四个专责组，谋划部署项目建设工作，研究制定项目实施计划，及时协调解决项目建设中出现的问题。严格落实项目法人制、工程监理制、合同管理制、招标投标制、工程项目公示制等制度。把工程质量和施工安全责任到人，严防廉政风险，确保工程建设质量和安全。

2. 执行监理制度，盯紧工程质量。始终坚持“质量第一”，强化质量监测，加强监管力度，严格执行工程质量标准，督促各方认真履行建设、施工、监理等职责，保证施工单位按照设计标准，高标准、高质量施工。

3. 多方协调沟通，合力推进完工。先后召开建设单位、施工单位、监理单位、设计单位推进会3次，严把施工前工程设计关和图纸审核关、施工时监管关等各环节管理，督促建设、施工、监理等各方认真履行工作职责，高要求、高质量、高标准施工。实行“一周一督查、一月一通报，对建设过程中遇到的问题，及时协调住建、自然资源、财政、发改等部门现场调度，解决建设中的困难和问题。

四、临泽县西关幼儿园建设项目是如何进行征地拆迁补偿发放的（包括但不限于发放人数、发放标准等）？

临泽县西关幼儿园建设项目的征地由沙河镇人民政府负责，所有拆迁补偿发放我们都没有参与，也不清楚。

五、临泽县西关幼儿园投入运行后是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥。

（一）监督管理的主要方式

1. 建立健全管理制度。幼儿园依据相关法律法规和政策，制定并执行完善的内部管理制度，包括教学质量管理制度、安全管理制度、教职工管理制度等，确保各项工作的规范化、制度化。

2. 投诉与违规处理。建立健全的投诉处理流程和违规处理机制，对家长和社会公众的投诉及时响应，对发现的违规行为进行严肃处理，保障各方权益。

（二）后续管理制度的建立：幼儿园定期组织教学质量评估和教研活动、建立健全设施设备管理制度、严格执行财务管理制度，同时，接受相关部门的审计和监督，确保经费使用的合规性和效益性。建立健全的家校互动机制，定期举办家长会、开放日等活动，高度重视安全管理工作，建立健全安全管理制度和应急预案，定期组织安全演练和培训，提高全体教职工和幼儿的安全意识和应对突发事件的能力。

六、临泽县西关幼儿园投入运行后增加了多少就业人员，通过何种方式进行招聘任用的？

临泽县西关幼儿园投入运行后共有正式在编教职工 20 人，通过向社会发布招聘广告聘用食堂操作人员 3 人，保洁人员 1 人，安保人员 1 人。

七、请您谈谈在幼儿教学过程中有那些优秀经验或做法。

1. 儿童为本，创设游戏化的三养三润环境。一是精心筹划，打造属于幼儿自己的农耕园。幼儿园农耕园目前栽种蔬菜、水果、中药材等 40 余种，在美化幼儿园环境的同时为幼儿观察植物生长，体验劳动、开展课程打好了基础。二是教师根据课程开展采

用多种形式创设班级、楼道环境，以匠心施彩，以爱心跟随，与幼儿共构、共创班级游戏环境。二是在活动室区域中投入了丰富的低结构、半成品、操作性强的材料，功能室的材料也逐步丰富。

2. 悦读润心，开展“西宝悦读乐园”活动。将早期阅读有机融合在主题教育之中，各班根据幼儿年龄特点选择优秀绘本图书，约定“故事时间”，用贴画、盖印章、贴小红旗等多种方式打卡记录，争当“阅读小明星”；每周五进行“图书漂流”，幼儿把自己喜欢的书借回家和爸爸妈妈一起“亲子共读”。开展以“红孩子读经典 红色基因代代传”为主题的红色绘本宣讲活动。

3. 传承传统文化，开展丰富的主题活动。一是开展“温情三月 与爱相伴”亲子活动，家长和幼儿一起进行亲子制作让幼儿在感受爱的陪伴的同时懂得用更多方式去表达爱，付出爱。二是举办“乐享春耕 播种希望”春耕节活动，孩子们在丰富多彩的活动中了解中国二十四节气文化，体验劳动快乐。三是开展“清明节”“端午节”“母亲节”等主题活动。四是举办学前教育宣传月主题文艺汇演，将幼儿艺术成果以经典颂唱、舞蹈、情景剧、戏曲、器乐等节目形式把科学保教的理念传递给师幼和家长。五是举办“童年如画，筑梦启航”幼儿创客作品展示，诚挚邀请家长携手幼儿步入创意乐园，共同见证幼儿艺术探索之路的璀璨启程。六是将“非遗”请进校园，开启“非遗文化寻觅之旅”快乐游园，通过直接感知、动手体验、实践操作等方式，让幼儿体验“面塑”“泥塑”“京剧变脸”“扎染”“编织”等活动的乐趣，领略非遗文化之美，七是举行“我的快乐我做主”美食品享活动，增强幼儿

的责任意识、感恩情怀，帮助幼儿形成勤俭节约优良品质。八是组织大中班小朋友到西关小学开展丰富多彩的幼小衔接活动，切实推进幼小双向衔接、科学衔接、有效衔接。

八、请您谈一谈在临泽县西关幼儿园建设项目运行过程中存在的困难或问题？

一是上级专项配套资金不到位，有缺额资金。二是为了幼儿园修建，争取地方专项债券1000万，每年偿还利息32.3万元，幼儿园需用公用经费偿还，造成了幼儿园运行困难。

附件四 基础信息表


 表 2 临泽县西关幼儿园建设项目工作人员情况表
 填制单位（盖章）：

序号	幼儿园工作人员岗位名称	人数（人）	备注
1	幼师	20	
2	保安	1	
3	厨师	3	
4	保洁	1	
			

（请根据幼儿园实际情况进行增减）

表3 临泽县西关幼儿园建设项目基础数据收集表

填制单位（盖章）：

序号	名称	数据	备注
1	该项目预算批复数（万元）	3154.47	
2	实际到位资金（万元）	2474	截止 2023 年年底
3	实际支出资金（万元）	2474	截止 2023 年年底
4	项目预算批复数（万元）	2025.91	
5	项目实际成本（万元）	2025.04	
6	教学楼一层计划建设面积（m²）	1609.91	
7	教学楼二层计划建设面积（m²）	1412.3	
8	教学楼三层计划建设面积（m²）	1412.3	
9	教学楼一层实际建设面积（m²）	1629.45	
10	教学楼二层实际建设面积（m²）	1657.32	
11	教学楼三层实际建设面积（m²）	1657.32	
12	计划新建门卫室总建筑面积（m²）	36.55	
13	实际新建门卫室总建筑面积（m²）	36.55	
14	计划新建砖垛铁艺围墙（米）	426	
15	实际新建砖垛铁艺围墙（米）	186	
16	计划新建砖垛铁艺围墙墙高（米）	2.1	
17	实际新建砖垛铁艺围墙墙高（米）	2.02	
18	征地拆迁补偿应发放数（万元）	185.91	含小学无法分开
19	征地拆迁补偿实际发放数（万元）	185.91	含小学无法分开
20	征地拆迁补偿应发放人数（人）	111	含小学无法分开
21	征地拆迁补偿实际发放人数（人）	111	含小学无法分开
22	本区域符合入园条件幼儿数（人）	197	
23	入园幼儿数（人）	197	
24	接到入园幼儿家长投诉数（件）	0	
25	投诉整改数（件）	0	

表 1 临泽县西关幼儿园建设项目计划实施情况表

填制单位（盖章）：



序号	项目名称	项目实施内容	项目完成情况	项目招标价 (万元)	项目中标 价 (万元)	项目支出 情况 (万元)	项目是否 进行完工 验收 (是/否)	备注
	临泽县西关幼儿园建 设项目	临泽县西关幼儿 园建设项目	已完成	2025.91	2025.04	1850	是	

附件五 主评人资质证明

甘肃省财政厅 甘肃省人事厅 文件

甘财会〔2006〕33号

关于孔德瑞等 71 名同志具备高级 会计师职务任职资格的通知

各有关厅（局）、市（州）人事局、职改办：

经甘肃省会计专业高级职务任职资格评审委员会 2006 年 12 月 15 日会议评审通过，孔德瑞等 71 名同志具备高级会计师职务任职资格。现将名单通知如下，请予公布并通知本人。

一、兰州市 9 人

孔德瑞 兰州塑料工业总公司
刘虎前 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司
杨 梅 兰州市城市建设设计院
王灵蕙（企业有效） 兰州佛慈制药股份有限公司
赵祎玲 兰州市政建设集团有限责任公司
陈淑萍 兰州市热力公司筹建处

孙琦 兰州路博兰炼添加剂有限公司

仵宇庆 兰州科近泰基新技术有限责任公司

颀燕 兰州金慧伟业商贸有限公司

二、定西市 2 人

孙维民 甘肃荣成会计师事务所

魏彩祥 定西市财政局

三、庆阳市 3 人

张兴龙 庆阳市林业局

田锋 庆阳市财政学校

姚培俊 庆阳市非税收入管理局

四、临夏州 2 人

赵淑丽 甘肃刘家峡水电联业有限公司

安涛 临夏州教育科学研究所

五、武威市 1 人

谢荣胜 武威市粮食局

六、天水市 2 人

丁子繁(小转大) 天水金桥房地产开发有限公司

罗小琴 天水市财政局

七、兰州市商业银行 1 人

李军 兰州市商业银行

八、省委办公厅 1 人

毕悦华 省委办公厅

九、省卫生厅 2 人

王国秀 甘肃省妇幼保健院

王 洁 省人民医院

十、省食品药品监督管理局 1 人

雷 虹 省药品检验所

十一、省人才交流开发服务中心 1 人

唐洪广 北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所

十二、省人事厅开发区人才资源管理处 1 人

何鹏举 甘肃励致会计师事务所有限公司

十三、省地质矿产勘查开发局 1 人

司一秀(单位有效) 省地质环境监测院

十四、省教育厅 4 人

曾潮洁 兰州交通大学财务处

刘梅芳 合作民族师范高等专科学校

赵云霞 兰州城市学院

段瑞祥(单位有效) 兰州城市学院

十五、省国家税务局 1 人

程国华 金昌市国家税务局第四分局

十六、甘肃建工集团 4 人

陈 毅 甘肃第一建筑工程有限责任公司

王晋洲 省建筑运输公司

王晋洲 省建筑运输公司

贺建林 甘肃第六建筑工程有限责任公司

十七、省林业厅 2 人

刘成玲 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局

孟丽萍(单位有效) 省林业厅三北防护林建设局

十八、省交通厅 3 人

黄利秀 省交通会计学会

杨建军 省交通科学研究所有限公司

罗富团 省交通厅

十九、省引洮水利水电开发有限责任公司 2 人

杨彪

张玮(企业有效)

二十、兰州长城电工股份有限公司 2 人

张岚 兰州长城电工股份有限公司

王家斌 天水二一三电器有限公司

二十一、省粮食局 5 人

郭伍宏 省粮食局

刘力宏 省粮食局

李莉 省粮食局景家店仓库

南兵 省粮食局打柴沟仓库

张尚琴(企业有效) 省粮食局白银植物油仓库

二十二、省新闻出版局 1 人

单位有效) 甘肃人民出版社

二十三、西北民族大学 1 人

黄建萍

二十四、兰州大学 1 人

卢晓雅 兰州大学科技广场

二十五、华龙证券有限责任公司 1 人

高 敏

二十六、中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 1 人

张红霞

二十七、兰石集团有限公司 1 人

徐建华

二十八、省国防科工办 2 人

张清阳 甘肃工业职业技术学院

庞长兰(兰外有效) 甘肃工业职业技术学院

二十九、省气象局 1 人

张晓玲

三十、省建设厅 1 人

冯春捷 省建设工程交易中心

三十一、窑街矿务局 2 人

李凤荣 窑街煤电公司资金结算中心

乔文斌(企业有效) 窑街煤电公司会计管理中心

三十二、省农垦集团有限责任公司 2 人

高书林 国营老农

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

何润芳 省农垦农工商联合总公司

三十三、省劳动和社会保障厅 1 人

贾润泽(单位有效) 省社会保险事业管理局

三十四、长庆石油勘探局 2 人

杜玉明 长庆石油勘探局钻井工程总公司

刘巨军 长庆石油勘探局钻井工程总公司

三十五、省审计厅 2 人

胡明才 合盛会计师事务所


张 薇 省审计厅外资处

三十六、省地方税务局 1 人

杨传红(单位有效) 兰州市七里河区地方税务局

三十七、省广播电影电视局 1 人

马 达(单位有效) 省广播电影电视总台



二〇〇六年十二月十八日

主题词：会计 职称 通知

抄报：财政部、人事部

抄送：各有关单位

省财政厅
nova7 5G
AIQUAD CAMERA

2006 年 12 月 19 日印发

姓 名 贺建林

性 别 男

出生年月 1986.10

出生地点 _____

资格名称 高级会计师

资格级别 高级

评审时间 2006.12.15

评委会名称 湖南省会计专业技术评审委员会



持证人签名: 贺建林

姓名 贺建林

性别 男 民族 汉

出生 1956 年 12 月 15 日

住址 甘肃省兰州市城关区皋兰
路221号



公民身份号码 620102195612153937



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 兰州市公安局城关分局

有效期限 2007.07.27-长期

主评人情况表

姓名	贺建林	单位	甘肃道瑞科技咨询有限公司	学历	大专
职称	高级会计师	职务	部门经理	拟在本项目任职	主评人
近五年内工作经历（近三年内绩效评价工作经历）					
时间	项目名称		项目概况		任职情况
2018 年-2020 年	江西洛钼股份公司担任财务总监		承担公司财务工作的把控和监督管理工作。		财务总监
2020 年 5 月	甘肃省总工会“劳模补助”资金项目绩效评价		对 2019 年甘肃省总工会“劳模补助”资金项目的发放情况进行绩效评价。		项目总监
2020 年 8 月	甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效评价		对 2019 年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门支出进行评价工作。		项目总监
2021 年 9 月	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-省级公路建养资金		对 2020 年一般债券 10 亿元用于全省 14 个市州公路建设和养护绩效评价。		项目总监
	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-小型水库移民扶助基金		对小型水库移民扶助基金项目是根据水库移民后期扶持政策设立的，项目在水库移民遗留问题、改善库区及安置区居民的生产生活条件、保护移民权益、维护库区社会稳定方面。		项目总监
2022 年 3 月	2016-2020 年新农村现代流通服务网络建设资金“网上供销社”服务平台建设资金绩效评价服务项目		对全省 66 个“新网工程”工程项目，涉及全省 13 个市州、20 个区县供销社和省供销集团 10 户直属企业及市县社属企业，项目资金共计 6000 万元。		主评人
2022 年 5 月	2021 年度省级部门绩效自评结果财政抽查复核工作		对 20 家省级部门单位 21 年度自评报告及自评表抽查复核。		项目总监
	2021 年度市级预算执行情况财政重点绩效评价工作购买服务项目-部门整体评价		对金昌 8 个部门（民政局、公安局、招商局、商务局、司法局、自然资源局、政府办、文广旅）单位整体支出绩效评价。		主评人

2022 年 6 月	甘肃省财政厅甘肃省县级财政运行综合绩效评价项目	对 6 个县区（甘谷县、康县、金塔县、甘州区、庄浪县、正宁县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
2022 年 8 月	民政厅部门整体支出绩效评价项目	对甘肃省民政厅 2021 年部门重点项目及资金量大的项目进行绩效评价。	主评人
2022年9月	网络建设运维维护费项目支出绩效评价、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目支出绩效评价	对省公安厅网络建设运维维护费项目支出、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目进行绩效评价。	主评人
2023年5月	甘肃省财政厅县级财政运行综合绩效评价项目	对4个县区（张家川县、会宁县、合水县、泾川县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
	高标准农田建设项目绩效评价服务	对2022年度甘肃省高标准农田建设项目进行绩效评价，涉及资金3.16亿元。	主评人
2023年6月	青穗工程-困难家庭子女普通高校入学资助项目绩效评价服务	对共产主义青年团甘肃省委员会2022年青穗工程一困难家庭子女普通高校入学资助项目进行绩效评价，涉及预算金额8005.2万元。	主评人
